

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
최우식		


1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	방배동 905-3 증축 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	11181176066 (92600395947)
	공사기간	2026-02-01 ~ 2026-05-31	공사금액	338,800,000 원
	책임자	이상억	연락처 (이메일)	010-4402-0780 (in577sang@kdhousing.bizme ka.com)
	주소	서울 서초구 방배로 118		

본사	회사명	(주)경동하우징	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-0650922 (111-81-17606)
	면허번호	은평 2017-11-1	연락처	023561277
	주소	서울시 영등포구 양평로5 성원빌딩7층		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-20
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	58%
횟수	(6) 회차 / 총 (8) 회	담당 요원	최우식 최우식
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 이상억 / 서명 이상억) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 철거작업 / 작업인원 : 2명/ 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 시스템 비계 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 시스템 비계 벽이음철물 미설치로 인한 붕괴 위험 2) 단부로 이동 중 이동통로 위에서 추락 위험 3) 안전난간 미설치로 인한 추락 위험		

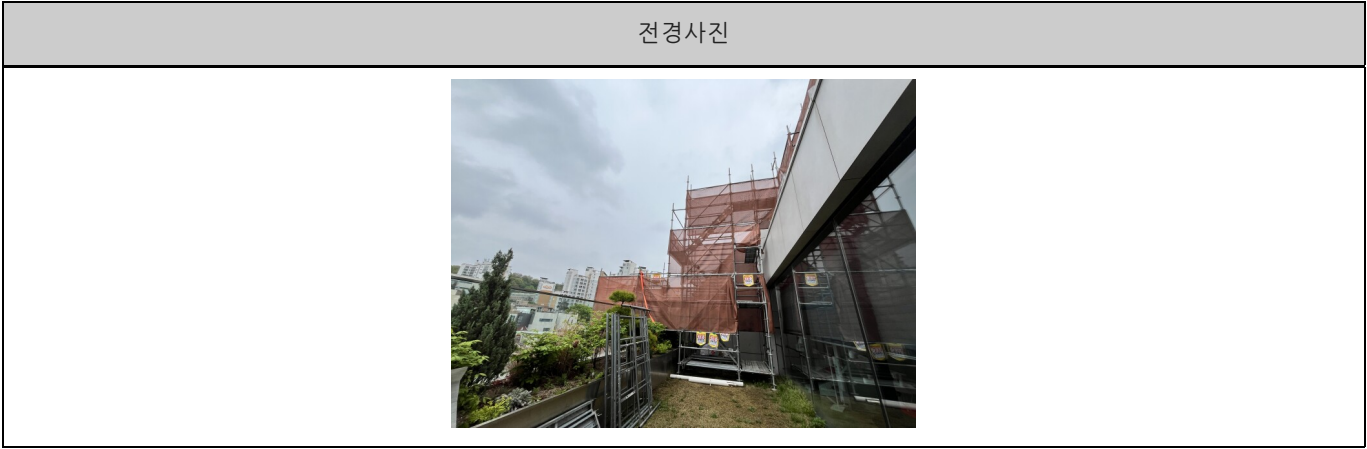

건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치						
구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☒	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☒	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-01 (2026-04-20)	내부	작업장 내 통로구간 자재 적치 시 근로자 이동 중 넘어짐 및 맞음 위험	[기술지도요원 강조사항] 작업장 내 넘어질 위험이 있는 자재, 기계기구 등은 지정된 장소에 보관하여 충돌 및 기타 위험을 예방 할 것 ----- * 불안정한 자재 적치상태로 인한 근로자 맞음 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조(가설통로의 구조) [물건을 적치 할 경우 평평한 곳에 두고 전도되거나 굴러떨어질 위험이 없게 고정할 것.] [이동통로 안전사항] - 경사는 30도 이하로 할 것. 다만, 계단을 설치하거나 높이 2m 미만의 이동통로로서 튼튼한 손잡이를 설치한 경우 제외 - 견고한 구조로 할 것 - 경사가 15도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 않는 구조로 할 것 - 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것. 다만, 작업상 부득이한 경우는 필요한 부분만 임시 해체가능 - 수직갱에 이동된 통로의 길이가 15m 이상인 경우에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것 - 낙하, 굴러떨어질 우려가 있을 경우 그렇지 아니하게 고정된곳에 고정시킬 것. - 작업장 주변에 통제하고 관계근로자 외 출입을 통제할 것.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-01 (2026-04-20)	내부	화학물질 취급 작업 전 물질안전보건 교육 미실시, MSDS 비치로 인한 근로자 눈손상, 피부접촉 위험, 소화기 미배치로 화재위험	[기술지도요원 강조사항] 화학물질 취급 작업 전 반드시 msd s교육 및 작업장 내 게시 할 것 ----- [산업안전보건법 제114조(물질안전보건 자료의 게시 및 교육)] [산업안전보건법 제116조(물질안전보건 자료와 관련된 자료의 제공)] - 물질안전보건자료대상물질을 취급 하려는 사업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나 제공받은 물질 안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건 자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖 추어 두어야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물 질을 취급하는 작업과정별로 고용 노동부령으로 정하는 바에 따라 물 질안전보건자료대상물질의 관리 요 령을 게시하여야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물 질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. - 고용노동부장관은 근로자의 안전 및 보건 유지를 위하여 필요하면 물질안전보건자료와 관련된 자료를 근로자 및 사업주에게 제공할 수 있다.	해당 작업 종료


지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-01 (2026-04-20)	내부	작업 시작 전 TBM 및 위험성평가 실시 상태 양호	[기술지도요원 강조사항] 작업 전 TBM 및 위험성평가 실시하여 작업 중 안전사고 예방을 철저히 함 ----- [산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)] - 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아낸다. - 찾아낸 유해·위험요인 - 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가. - 찾아낸 유해·위험요인 - 평가결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치하기. - 찾아낸 유해·위험요인 - 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치하기. - 사업주는 찾아낸 유해·위험요인 평가 시 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 작업장의 근로자를 참여시켜야 한다. - 사업주는 찾아낸 유해·위험요인 평가의 결과와 조치사항을 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 기록하여 보존하여야 한다. - 찾아낸 유해·위험요인 평가의 방법, 절차 및 시기, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부장관이 정하여 고시한다.	


4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	시스템 비계 벽이음 연결재 미설치로 인해 붕괴, 낙하, 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 시스템 비계 설치 시 벽이음 철물 고정 확인 미설치 시 시스템 비계 붕괴, 추락 위험이 있으므로 반드시 준수할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조 (시스템 비계의 구조)] - 사업주는 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에 다음 각 사항을 준수하여야 한다. - 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치할 것. - 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 할 것. - 수직재 · 수평재 · 가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 할 것. - 수평재는 수직재와 직각으로 설치할 것. - 수평재는 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것. - 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것. - 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치할 것.	가능성 (3) 중대성 (3)  높음(9) 즉시 개선 즉시 이행가능

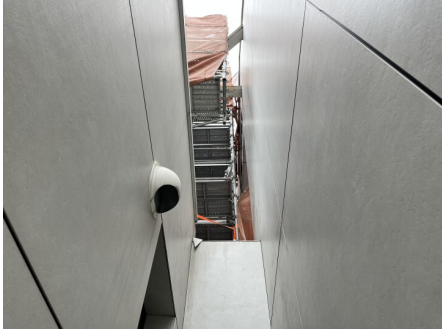유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	추락 단부구간 안전난간 미설치로 인한 추락 위험, 낙하물 방지망 미설치로 자재 낙하로 인한 맞음 위험 	[기술지도요원 강조사항] 추락 위험구간 안전난간 설치, 낙하물 위험구간 낙하물 방지망 설치로 추락, 낙하 위험을 예방 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조 (작업장-낙하물에 의한 위험의 방지)] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 낙하물 방지망 및 수직보호망은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준에서 정하는 성능기준에 적합한 것을 사용하여야 한다. - 낙하물 방지망, 방호선반을 설치하는 경우에는 다음 각 사항을 준수해야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계·설비·선박 블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 아니할 것. - 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상이 되도록 할 것.	가능성 (3)
			중대성 (2)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

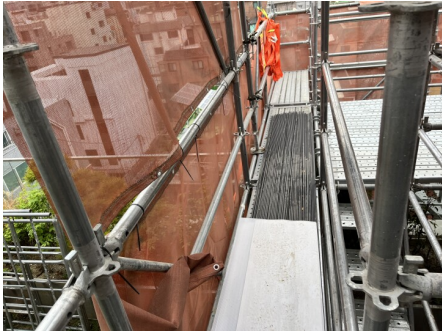유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	시스템 비계 작업발판 위 자재 적치 시 낙하되어 하부 근로자 맞음, 이동 중 전 도 위험 	[기술지도요원 강조사항] 시스템 비계 작업발판 위 이동통 자재 적치 금지 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조 (가설통로의 구조) [이동통로 안전사항] - 가설계단의 경사각은 30° ~ 60° 를 유 지하여 설치하도록 할 것 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치할 것 - 발판 높이는 23cm 이하이어야 하고, 일 정한 간격으로 설치할 것 - 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15m 이 상인 경우에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것 - 발판 너비는 23cm 이상으로 하고, 바닥 면은 미끄러짐 방지 기능을 가지고 있을 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 근생시설 신축공사 현장에서 재해자가 비계 해체 작업 중 9.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망 예방대책 : 비계 해체작업은 관리감독자의 지휘하에 작업을 실시하고 해체는 계 획에 따라 규칙적으로 진행되어야 하며, 수평부재부터 차례로 해체 합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 철거작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철거작업	추락 단부구간에서 작업 중 안전난간 미설치, 안전대 미착용, 안전고리 체결시설 미흡 인해 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 개구부 등 추락할 위험이 있는 공간에는 반드시 안전대를 지급하여 착용하거나 추락방지조치를 실시할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등) [안전대 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] - 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치할 것 - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 - 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검할 것 - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
철거작업	중량물 인양 작업에 사용하는 로프의 노후화로 인해 파단, 낙하물 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] 중량물 작업 전 작업계획서 작성 및 이행 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제385조(중량물 취급)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제663조(중량물 작업-중량물의 제한)] - 사업주는 중량물을 운반하거나 취급하는 경우에 하역운반기계·운반용구를 사용하여야 한다. - 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어 올리는 작업을 하는 경우에 과도한 무게로 인하여 근로자의 목·허리 등 근골격계에 무리한 부담을 주지 않도록 최대한 노력해야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철거작업	이동식 크레인 사용 중 2줄걸이 미설치, 섬유로프 파손으로 인한 자재 등 추락, 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 크레인 작업 전 지반상태를 확인하고 작업 시 아웃트리거를 설치하여 전도사고를 예방할 것, 작업 중 중량물 인양 시 2줄걸이 설치, 로프 상태 확인하여 낙하, 맞음사고를 예방할 것 ----- * 이동식 크레인 사용 시 2줄걸이 미이행으로 인한 낙하, 피해 위험 * 이동식 크레인 작업 시 붐대 흔들림으로 인해 충돌 위험 * 이동식 크레인 작업 시 2줄걸이 및 훅해지장치 미설치로 인한 낙하 위험 [이동식 크레인 붐대가 흔들리지 않도록 아웃트리거 설치, 지반상태 확인 할 것.] [이동식 크레인 사용 시 2줄걸이로 인양 할 것.] [이동식 크레인 작업 시 2줄걸이 인양 및 훅해지장치를 확인하고 작업 할 것.] - 이동식 크레인 작업 시 2줄걸이로 인양 할 것. - 이동식 크레인 작업 시 훅해지장치를 확인하고 체결하여 작업 할 것. - 작업 전 작업계획서를 작성하고 이행 할 것. - 하물을 인양 할 때에는 2줄걸이로 인양 할 것. - 이동식 크레인 작업 전 아웃트리거를 설치하여 붐대 흔들림을 방지 할 것. - 이동식 크레인 작업 전 지반상태를 확인 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해 · 위험요인**	유해 · 위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철거작업	시스템 비계 설치 작업 중 안전 고리 미체결로 인한 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 시스템 비계 설치 전 순서도 작성, 작업계 획서 작성, 특별교육 실시하여 작업 중 추 락 등 기타 재해를 예방 할 것 ----- * 시스템 비계 안전난간 해체 작업 시 조립 순서 미준수, 안전대 미착용으로 인한 추락 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조(시스 템 비계의 구조)] [시스템 비계 안전난간 해체 작업 시 조립 순 서 준수, 안전대를 착용 하여 추락을 예방 할 것.] - 사업주는 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에 다음 각 사항을 준수하여 야 한다. - 수직재 · 수평재 · 가새재를 견고하게 연결하 는 구조가 되도록 할 것. - 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도 록 설치할 것. - 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 할 것. - 시스템 비계 안전난간 해체 전 관리감독자 에게 보고 할 것. - 시스템 비계 안전난간 해체 작업 시 반드시 안전대를 지급하고 부착설비에 연결하여 작 업을 진행 시킬 것. - 시스템 비계 해체 순서도를 작성하고 그에 따라 작업 할 것.	가능성 (3)
		중대성 (3)	
		 높음(9) 즉시 개선	
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집 · 동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치 · 수리 및 방수 등		** 유해 · 위험요인 ① 건축 · 구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막 이 지보공 등 ② 기계 · 장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레 인, 타워크레인, 항타 · 항발기 등 ③ 기타 - 가스 · 전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

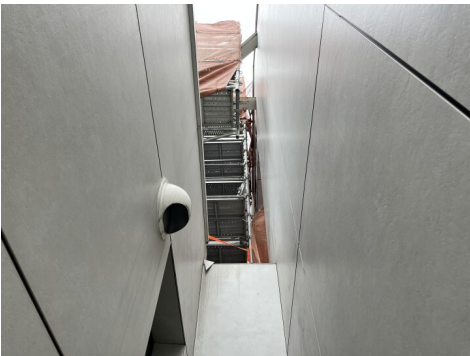
기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	추락 위험에 따른 안전수칙		
	제공수(종류)	1종	교육인원	1명
	교육내용	1. 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수 2. 안전대 착용, 안전고리 체결 준수 3. 안전대 걸이시설 설치 4. 안전난간 해체 금지		

장비

사진	내용			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	외부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			

기타

사진	내용	
	지원사항	12대 사망사고 기인물(추락)
	구체적 사항	- 1m 초과 단부(개구부)에는 안전난간 설치 - 추락방호망, 수직보호망 등 낙하 및 추락 방지 조치 - 작업전 TBM을 통해 단구(개구부) 위치 주지 시킬것 - 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용 - 안전난간, 추락방호망 등 방호장치 임의 해체 금지 - 방호장치 손상 및 이상 발견 시 즉시 관리감독자 보고 및 즉시개선
	비고	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-02-01~2026-04-20	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
