

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
최우식		

1. 기술지도 대상사업장


현장	현장명	석촌동 184-4 리모델링공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	111-81-17606-6 (925-12-49423-7)
	공사기간	2025-09-01 ~ 2026-06-30	공사금액	1,831,500,000 원
	책임자	김영광	연락처 (이메일)	010-5351-3411 (youngk3411@hanmail.net)
	주소	서울시 송파구 송파대로 461		

본사	회사명	(주)경동하우징	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-0650922 (111-81-17606)
	면허번호	은평 2017-11-1	연락처	023561277
	주소	서울시 영등포구 양평로5 성원빌딩7층		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-17
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	36%
횟수	(12) 회차 / 총 (16) 회	담당 요원	최우식 최우식
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김영광 / 서명 김영광) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 거푸집,금속작업 / 작업인원 : 9명 / 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구: 해당없음 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 중량물 인양 작업 중 자재 낙하로 인한 맞음 위험 2) 거푸집 작업 중 계단 단부에서의 추락 위험 3) 단부 구간 안전대 미착용, 안전난간 미설치로 인한 추락 위험		

전경사진

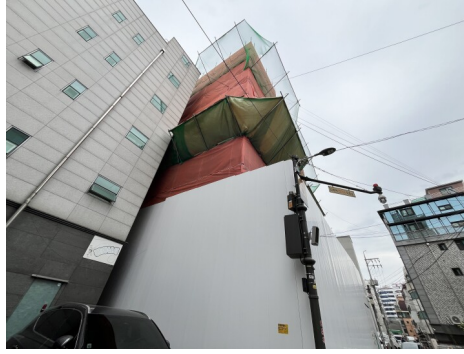

건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☒	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-03 (2026-04-17)	외부	시스템 비계 안전난간 미설치, 안전 고리 체결 미흡으로 인해 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 시스템 비계 안전난간 해체 시 안전대를 지급하고 착용하게 하여 추락사고를 예방 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등) [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] [안전대 안전사항] - 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치할 것 - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 - 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검할 것 - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	이행

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-03 (2026-04-17)	외부	이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 설치 상태 양호, 최단단 사용, 안전 고리 미체결로 인한 추락 시 중대재 해 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 설치, 최단단 사용 금지할 것 또한, 추락 위험이 있으므로 반드시 안전대 착용, 안전고리 체결하 여 추락사고 예방 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌 어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추 락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제4 4조(안전대의 부착설비 등) [안전대 안전사항] [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추 락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에 게 안전대를 착용시킨 경우 안전대 를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치할 것 - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리 는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 - 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검할 것 - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승 강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리 (안전난간사다리)를 사용하고 안전 대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-03 (2026-04-17)	내부	고속절단기 사용 시 비산되는 목재 등의 먼지에 의해 근로자 눈손상 등 위험, 방호장치 미설치로 인해 절단 베임 위험 	[기술지도요원 강조사항] 고속절단기 사용 시 방호장치 설치, 볼티비산방지포 설치하여 절단, 베임, 화재 등 사고예방 할 것 ----- * 고속절단기 사용 시 보호구(방진마스크, 보안경)미착용으로 인한 눈손상, 호흡기 질환 위험 * 고속절단기 사용 시 방호장치(날접축예방장치) 미설치 등으로 인한 절단, 베임 위험 [고속절단기 사용 시 방호장치(날접축예방장치)를 설치하여 위험 예방 할 것.] [고속절단기 사용 시 보호구(방진마스크, 보안경)착용 할 것.] - 고속절단기 사용 전 방호장치(날접축예방장치) 설치 상태 확인 할 것. - 고속절단기 사용 작업 근로자에게 방진마스크를 지급하고 착용하게 할 것. - 고속절단기 사용 작업 근로자에게 보안경을 지급하고 착용하게 할 것. - 고속절단기 사용 시 볼티비산방지포를 사용하여 볼티 비산을 예방 할 것. - 고속절단기 사용 시 소화기 배치하여 화재, 폭발을 예방 할 것.	이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	단부구간에 안전난간, 안전대 걸이시설 미설치로 인해 근로자 작업 중 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 현재 시스템비계가 전 구간 설치되어 있지만 일부 구간 안전난간 미설치로 인한 추락 위험 안전대 착용, 비계-외벽사이 추락방지 망 설치 등으로 추락 사고 예방 할 것 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (추락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계 · 설비 · 선박 블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 아니할 것. - 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상이 되도록 할 것. - 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 추락방호망의 내민 길이는 벽면으로부터 3m 이상 되도록 할 것. - 평탄하고 견고하며 미끄럽지 않은 바닥에 이동식 사다리를 설치할 것. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	철골의 추락방호망 설치 하였지만 훼손, 고정 미흡으로 인한 추락 시 중대재해 위험 	[기술지도요원 강조사항] 추락방호망의 점검, 보수를 통해 추락 시 중대재해를 예방 할 것 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제45조 (추락-지붕 위에서 작업의 위험방지)] - 사업주는 근로자가 지붕 위에서 작업을 할 때에 추락하거나 넘어질 위험이 있는 경우에는 다음 조치를 해야 한다. - 지붕의 가장자리에 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우에 따른 안전난간을 설치할 것. - 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30cm 이상의 발판을 설치할 것. - 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치할 것. - 사업주는 지붕의 가장자리에 안전난간 설치, 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 추락방호망을 설치해야 한다. - 사업주는 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능
외부	가스 등의 인화성물질 보관 시 잠금장치 미설치, MSDS자료 미게시로 인한 화재, 폭발 위험 	[기술지도요원 강조사항] 화학물질 보관 시 잠금장치 설치, 화재 예방을 위한 소화기 설치 등 이행할 것 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제234조 (가스의 용기) * 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 [물질안전보건자료 안전사항] [가스의 용기 안전사항] - 물리, 화학적 특성, 독성에 관한 정보가 작성되어 있을 것 - 폭발·화재 시의 대처방법, 응급조치 요령이 작성되어 있을 것 - 대상화학물질 취급근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 물질안전보건자료 항상 게시할 것 - 물질안전보건자료 용기 및 포장에 경고 표지 부착 또는 인쇄 등 유해·위험 정보가 나타나도록 할 것 - 경고표지를 부착하거나 경고표지 내용 인쇄 방법 표시가 곤란한 경우 경고표지를 인쇄한 꼬리표를 달아 둘 것 - 작업전 가스 누출여부 점검할 것 - 작업종료 후 밸브 잠금 확인하고 지정공간에 보관할 것 - 운반하는 경우에는 캡을 씌울 것 - 사용 전 또는 사용 중인 용기와 그 밖의 용기를 명확히 구별하여 보관할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 근생시설 신축공사 현장에서 재해자가 비계 해체 작업 중 9.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망 예방대책 : 비계 해체작업은 관리감독자의 지휘하에 작업을 실시하고 해체는 계획에 따라 규칙적으로 진행되어야 하며, 수평부재부터 차례로 해체 합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 철골작업	4.	7.
	2. 골조작업	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철골작업	철골 작업 중 안전시설 미설치로 인한 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 철골작업 전 안전시설물 설치 후 작업 실시 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제380조(철골조립 시의 위험방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제382조(철골작업-가설통로의 설치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제381조(철골작업-승강로의 설치)] - 사업주는 철골을 조립하는 경우에 철골의 접합부가 충분히 지지되도록 볼트를 체결하거나 이와 같은 수준 이상의 견고한 구조가 되기 전에는 들어 올린 철골을 걸이로프 등으로부터 분리해서는 아니 된다. - 사업주는 근로자가 수직방향으로 이동하는 철골부재에는 답단 간격이 30cm 이내인 고정된 승강로를 설치하여야 하며, 수평방향 철골과 수직방향 철골이 연결되는 부분에는 연결작업을 위하여 작업발판 등을 설치하여야 한다. - 사업주는 철골작업을 하는 경우에 근로자의 주요 이동통로에 고정된 가설통로를 설치하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
골조작업	콘크리트 타설작업 중 호스의 요동에 의한 근로자 맞음 사고 위험	[기술지도요원 강조사항] 콘크리트 타설작업 중 호스의 요동을 방지하기 위해 적당한 타설속도 준수 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제335조(거푸집 동바리 등 조립-콘크리트 타설장비 사용 시의 준수사항)] - 사업주는 콘크리트 타설작업을 하기 위하여 콘크리트 플레이싱 붐, 콘크리트 분배기, 콘크리트 펌프카 등을 사용하는 경우에는 다음의 사항을 준수해야 한다. - 작업을 시작하기 전에 콘크리트타설장비를 점검하고 이상을 발견하였으면 즉시 보수할 것. - 건축물의 난간 등에서 작업하는 근로자가 호스의 요동·선회로 인하여 추락하는 위험을 방지하기 위하여 안전난간 설치 등 필요한 조치를 할 것. - 콘크리트타설장비의 붐을 조정하는 경우에는 주변의 전선 등에 의한 위험을 예방하기 위한 적절한 조치를 할 것. - 작업 중에 지반의 침하나 아웃트리거 등 콘크리트타설장비 지지구조물의 손상 등에 의하여 콘크리트타설장비가 넘어질 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 취할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
골조작업	거푸집 및 거푸집 동바리 해체 중 근로자 맞음 사고 위험	[기술지도요원 강조사항] 거푸집 해체 작업 시 상하부 동시작업 금지, 해당 층 통제할 것 ----- [콘크리트공사표준안전작업지침 제9조(거푸집공사-해체)] - 거푸집 해체작업 준수사항 - 순서에 의하여 실시하고, 안전담당자 배치. - 거푸집 해체작업 준수사항 - 콘크리트 자중 및 시공중에 가해지는 기타 하중에 충분히 견딜만 한 강도를 가질 때까지는 해체하지 않기. - 거푸집 해체 유의사항 - 안전모 등 안전보호구 착용. - 거푸집 해체 유의사항 - 거푸집 해체작업장 주위에는 관계자를 제외하고는 출입 금지. - 거푸집 해체 유의사항 - 상하 동시 작업은 원칙적으로 금지하여 부득이한 경우에는 긴밀히 연락을 취하며 작업.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

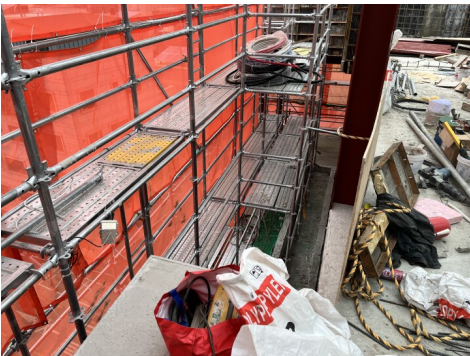
기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	실내건축 작업별 유해위험요인 및 안전대책	
	제공수(종류)	1종	교육인원 1명
	교육내용	1. 도장 및 방수작업 시 물질안전보건자료 교육 및 게시 2. 도배, 내장목공 작업 중 이동식 사다리 등 추락 예방 3. 타일작업 중 근골격계 질환 예방	

장비

사진	내용		
	장비명	산소농도측정기	측정 장소 외부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만	
	측정값	20.9%	적합 여부 적합
	비고		

기타

사진	내용	
	지원사항	12대 사망사고 기인물(추락)
	구체적 사항	- 1m 초과 단부(개구부)에는 안전난간 설치 - 추락방호망, 수직보호망 등 낙하 및 추락 방지 조치 - 작업전 TBM을 통해 단구(개구부) 위치 주지 시킬것 - 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용 - 안전난간, 추락방호망 등 방호장치 임의 해체 금지 - 방호장치 손상 및 이상 발견 시 즉시 관리감독자 보고 및 즉시개선
	비고	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2025-09-01~2026-04-17	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
