

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
홍우식		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	A-PJT 홍보 라운지 설계 및 축조 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	22081381096 (92503295247)
	공사기간	2025-03-21 ~ 2027-05-21	공사금액	1,281,500,000 원
	책임자	서연오	연락처 (이메일)	01088615757 (yo.seo@ewai.co.kr)
	주소	서울 강남구 언주로173길 18 (신사동)		

본사	회사명	(주)이웨이	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-1325201 (220-81-38109)
	면허번호	강남-98-01-28	연락처	02-553-6089
	주소	서울 강남구 언주로171길 16		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-17
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	75%
횟수	(8) 회차 / 총 (13) 회	담당 요원	최우식 홍우식
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 서연오 / 서명 서연오) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 내부인테리어작업(도장,바리솔설치작업) / 작업인원 : 9명/ 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 이동식 사다리, 이동식 비계 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 이동식 비계, 이동식 사다리 사용 중 전도, 추락 위험 2) 고속절단기 사용 중 불티로 인해 화재 위험 3) 페인트 작업 중 msds교육 미실시, 미게시로 인한 화학물질 사고위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☒	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

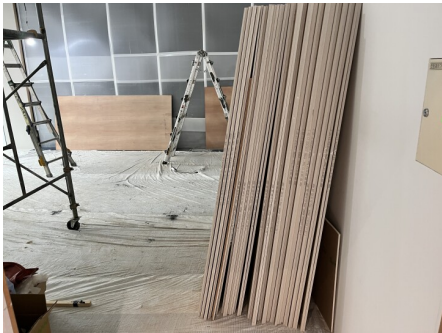
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-15 (2026-04-17)	내부	불안전한 작업발판의 사용으로 인해 추락 시 중대재해 위험 	[기술지도요원 강조사항] 불안전한 작업발판(플라스틱 의자) 사용 시 파손 등으로 인한 추락 위 험 반드시 말비계, 이동식 사다리 사 용하여 작업 실시할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제9 조(작업발판 등) [작업발판 안전사항] - 발판재료는 작업할 때의 하중을 견 딜 수 있도록 견고한 것으로 할 것 - 작업발판 폭은 40cm이상, 발판재료 간의 틈은 3cm이하로 할 것 - 추락의 위험이 있는 장소에는 안전 난간을 설치할 것 - 작업발판의 지지물은 하중에 의하 여 파괴될 우려가 없는 것을 사용 할 것 - 작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지 지 않도록 둘 이상의 지지물에 연 결하거나 고정시킬 것 - 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 경우에는 위험 방지에 필요한 조치 를 할 것	이행
2026-04-15 (2026-04-17)	내부	유리 등 적재물 전도로 인한 맞음, 갈림 위험	[기술지도요원 강조사항] 물건 적치 시 전도되지 않도록 접 근 통제 할 것 ----- * 불안정한 자재 적치상태로 인한 근 로자 맞음 위험 [물건을 적치 할 경우 평평한 곳에 두고 전도되거나 굴러떨어질 위험이 없게 고정할 것.] - 평평한 곳에 두고 전도되지 않도록 할 것. - 낙하, 굴러떨어질 우려가 있을 경 우 그렇지 아니하게 고정된곳에 고 정시킬 것. - 작업장 주변에 통제하고 관계근로 자 외 출입을 통제할 것.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-15 (2026-04-17)	내부	말비계 사용 작업 중 근로자 부주의 로 인한 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 말비계 사용 시 법적기준 준수, 안전모 등 개인보호구 착용 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계) [말비계 안전사항] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치 를 할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 - 지주부재 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것 - 지주부재와 지주부재 사이를 고정 시키는 보조부재를 설치할 것 - 높이가 2m를 초과하는 경우 작업발 판의 폭을 40cm 이상으로 할 것	이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
내부	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 개인 보호구 미착용 및 최상단 담단 작업 으로 전도 또는 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 중 아웃트리거 미설치, 2인1조 작업 미준수로 인한 전도, 추락 위험 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전 난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (3) 중대성 (2)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능
내부	적치된 자재(석고보드)에 의한 전도, 깔림 위험 	[기술지도요원 강조사항] 이동통로의 자재 등을 적치하여 전도 위험, 적치된 자재의 전도에 의한 깔림 위험이 있으므로 반드시 통로 외 별도 보관 실시, 접근통제 실시할 것 ----- * 불안정한 자재 적치상태로 인한 근로자 맞음 위험 [물건을 적치 할 경우 평평한 곳에 두고 전도되거나 굴러떨어질 위험이 없게 고정할 것.] - 평평한 곳에 두고 전도되지 않도록 할 것. - 낙하, 굴러떨어질 우려가 있을 경우 그렁지 아니하게 고정된곳에 고정시킬 것. - 작업장 주변에 통제하고 관계근로자 외 출입을 통제할 것.	가능성 (2) 중대성 (1)  낮음 (2) 필요에 따라 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 지식산업센터 기계.소방 공사 현장에서 소화배관 설치 실측을 위해 배관공이 이동식 사다리를 올라가다 1.7m 높이에서 떨어져 치료 중 사망 예방대책 : 평탄, 견고하고 미끄럼이 없는 바닥에서 2인1조로 작업하고 안전모를 반드시 착용합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 내부목공작업	4.	7.
	2. 도장작업	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
내부목공작업	이동식 비계 안전난간 미설치로 인해 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 비계 안전난간 설치 및 아웃트리거 설치하여 전도 및 추락사고 예방 ----- * 이동식 비계 설치 시 안전규칙 [이동식 비계 아웃트리거, 안전난간, 작업발 판 설치] - 이동식 비계 최상단에서 작업하는 경우 안 전난간을 설치하여 추락을 예방할 것. - 이동식 비계를 사용 할 경우 아웃트리거를 설치하여 전도를 방지할 것. - 작업발판 상단에 다른 발판 등을 설치하여 작업하지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
내부목공작업	목공 가공용 원형톱 사용시 겹 촉에 의한 근로자 재해 우려	[기술지도요원 강조사항] 톱날접촉예방장치를 설치하여 톱날사용 작 업시 근로자 재해 예방 바랍니다. ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제105조, 제106조(동근톱기계) [동근톱기계 안전사항] - 목재가공용 동근톱기계에는 톱날접촉예방장 치를 설치할 것 - 피복 손상 및 노출 주의 할 것 - 목재가공용 동근톱기계에 분할날 등 반발예 방장치를 설치할 것 - 주변 정리정돈할 것 - 근로자 보호구(보안경, 방진마스크 등) 착 용할 것 - 면장갑 착용 금지할 것 - 작업전 안전 교육 실시	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
도장작업	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 2인1조 작업 미이행으로 인한 전도 또는 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수 및 아웃트리거 설치 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
도장작업	화학물질 취급 작업 전 물질안전보건교육 미실시, MSDS 비미치로 인한 근로자 눈손상, 피부접촉 위험, 소화기 미배치로 화재 위험	[기술지도요원 강조사항] 화학물질 취급 작업 전 msds교육 및 게시 할 것 ----- [산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)] [산업안전보건법 제115조(물질안전보건자료 대상물질 용기 등의 경고표시)] - 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업공정별로 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의 관리 요령을 게시하여야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. - 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 이를 담은 용기 및 포장에 경고표시를 하여야 한다. - 다만, 용기 및 포장에 담는 방법 외의 방법으로 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시한 바에 따라 경고표시 기재 항목을 적은 자료를 제공하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (1)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	실내건축 작업별 유해위험요인 및 안전대책	
	제공수(종류)	실내건축 작업별 유해위험요인 및 안전대책	교육인원 3명
	교육내용	1. 도장 및 방수작업 시 물질안전보건자료 교육 및 게시 2. 도배, 내장목공 작업 중 이동식 사다리 등 추락 예방 3. 타일작업 중 근골격계 질환 예방	

장비

사진	내용		
	장비명	산소농도측정기	측정 장소 외부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만	
	측정값	20.9%	적합 여부 적합
	비고		

기타

사진	내용	
	지원사항	12대 사망사고 기인물(이동식 사다리)
	구체적 사항	*이동식 사다리 이용 시 아웃트리거를 설치하여 전도위험을 예방 할 것. *2인1조 작업을 준수하여 작업하여 전도, 비상시 위험상황을 예방 할 것. *작업 시 공구이탈방지끈 등을 사용하여 공구나 자재등이 낙하하지 않도록 예방 할 것. *최상단 발판을 사용하여 작업 하지 않도록 할 것. *가급적 승강용으로만 사용하고 중작업이상일 경우 이동식비계, 안전난간사다리 등을 이용할 것. *개인보호구를 착용 작업
	비고	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2025-03-21~2026-04-17	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망



강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**



태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**



기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
