

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	염리삼성아파트 지하주차장 내부 재도장 및 에폭시 재도장 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	13381342076 (92602972517)
	공사기간	2026-04-01 ~ 2026-06-10	공사금액	544,500,000 원
	책임자	성기성	연락처 (이메일)	010-4307-7889 (shico21@daum.net)
	주소	서울 마포구 백범로25길 63		

본사	회사명	신화건설(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	1349110012152 (133-81-34207)
	면허번호	경기97-3-7	연락처	02-898-1741
	주소	서울 마포구 백범로25길 63		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-08
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	1%
횟수	(1) 회차 / 총 (4) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 성기성 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 벽체 도장 작업 / 작업인원 : 7명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 믹서기 유해위험물질 : 페인트, 신나, 경화제 등 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 사다리 작업 등 고소, 상부 작업 시 전도, 추락 위험 2) 유해위험물질 취급 시 보호구 미 착용으로 인한 건강상해 위험 3) 주차장 작업의 특성상 이동 차량에 의한 충돌 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

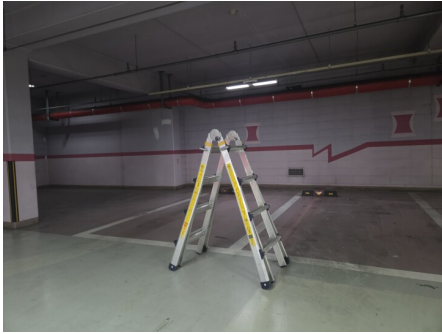
3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법								
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	고소, 상부 작업 시 안전고리 미 체결로 인한 근로자 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 안전고리 체결 후 작업 시작 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조 (안전대의 사용)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계 · 설비 · 선박 블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 이동식 사다리를 설치한 바닥면에서 높 이 3.5m 이하의 장소에서만 작업할 것. - 이동식 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에 올라서서 작업하지 않을 것. 다만, 높이 1m 이하의 사다리는 제외한다.	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	유해위험 물질 사용 시 보호구 미 착용 으로 인한 근로자 건강장해 위험  	[기술지도요원 강조사항] - MSDS교육 진행 후 서면 보관 할 것 - 작업전 해당 위험 전파 할 것 - 해당 위험에 맞는 보호구 지급 할 것 ----- * 화학물질에 대한 물질안전보건교육 미실 시로 피부 접촉 위험 * 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건 자료에 관한 기준 [물질안전보건자료 안전사항] [산업안전보건법 제114조(물질안전보건자 료의 게시 및 교육)] [물질안전보건교육을 실시] - 물리, 화학적 특성, 독성에 관한 정보가 작성되어 있을 것 - 폭발·화재 시의 대처방법, 응급조치 요령이 작성되어 있을 것 - 대상화학물질 취급근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 물질안전보건자 료 항상 게시할 것 - 물질안전보건자료 용기 및 포장에 경고 표지 부착 또는 인쇄 등 유해·위험 경 보가 나타나도록 할 것 - 경고표지를 부착하거나 경고표지 내용 인쇄 방법 표시가 곤란한 경우 경고표지 를 인쇄한 꼬리표를 달아 둘 것 - 작업 전 물질안전보건교육을 실시하여 근로자 피부 접촉 등을 예방 할 것.	가능성 (3)
			중대성 (2)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
주차장 내부 작업	주차장 작업 시 차량에 의한 근로자 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] - 신호수, 관리자 상주하여 차량 서행 유도 할 것 - 작업구역 설정 및 해당 위험성 교육 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차 시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 작업장 내 주차구역을 설정하여 한정된 곳에 주차할 수 있도록 할 것. - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치하는 등 차량이 이탈하지 않도록 예방 할 것. - 차량 등에 후방카메라를 설치하여 후진 시 시야를 확보할 수 있도록 할 것. - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것 - 소음경보기 등을 설치하여 차량 및 보행자가 작업장을 확인 할 수 있게 할 것 - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 지식산업센터 기계.소방 공사 현장에서 소화배관 설치 실측을 위해 배관공이 이동식 사다리를 올라가다 1.7m 높이에서 떨어져 치료 중 사망 예방대책 : 평탄, 견고하고 미끄럼이 없는 바닥에서 2인1조로 작업하고 안전모를 반드시 착용합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 벽체,바닥 도장 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
벽체,바닥 도장 작업	고소, 상부 작업 시 자재, 공구 등 낙하로 인한 근로자 상해 위 험	[기술지도요원 강조사항] -작업구역 설정하여 근로자,보행자 통제할 것 -상부,고소작업시 자재,공구 등 낙하 위험 성 교육진행할 것 -관리자 상주 및 전담 유도원 등 배치하여 위험 상황 대비할 것 ----- * 유리 양층 작업 중 자재 낙하물로 인한 근 로자 맞음 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(작업 장-낙하물에 의한 위험의 방지)] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등 에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우 려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요 한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거 나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지 망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금 지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 자재를 잘 고정할 수 있게 로프를 사용하여 고정시킬 것. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작업장 출 입을 금지시킬 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해 · 위험요인**	유해 · 위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
벽체,바닥 도장 작업	인력 양중,운반 시 근로자 근골 격계 질환 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 근로자 건강상태 점검 할 것 -해당 위험성 작업 전 교육 할 것 -단독 작업 금지 및 이상 징후 시 즉각 휴 식 및 전파 할 것 -뒷걸음질 금지 및 대차이용 교육 할 것 ----- [운반하역표준안전작업지침 제5조(인력운반하 역-작업중량)] [운반하역표준안전작업지침 제7조(인력운반하 역-인양)] [운반하역표준안전작업지침 제10조(인력운반 하역-중량물)] - 사업주는 작업조건, 작업환경, 작업대상의 형상, 근로자의 성별 및 연령 등 제반사항 고려. - 작업중량이 근로자의 안전과 건강에 위험을 초래하지 않도록 하기. - 인양물체 - 무게는 실측을 원칙으로 한다. - 인양물체 - 무게가 일정하지 않은 때에는 평균무게와 최대무게를 실측하여야 한다. - 인양물체 - 무게를 어렵잡은 때에는 가볍게 들어 개인의 인양능력에 충분한가를 판단하 여 인양. - 공동으로 중량물을 운반할 시 - 작업지휘자 의 지시에 따라 통일된 행동 수행. - 무게 중심이 높은 하물은 인력으로 운반 하 지 않기.	가능성 (3)
			중대성 (2)
			 높음(6) 즉시 개선
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집 · 동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치 · 수리및 방수 등		** 유해 · 위험요인 ① 건축 · 구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막 이 지보공 등 ② 기계 · 장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레 인,타워크레인, 항타 · 항발기 등 ③ 기타 - 가스 · 전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	작업 전 안전 점검 회의(TBM) 및 위험성 평가 지도 실시		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	[작업전 안전점검 회의] -TBM 중요성, 절차, 실행 시간, 주기, 장소 등 설명 [위험성 평가 관련 내용] -최초위험성 평가, 상시위험성 평가 실시 방법, -유해위험요인 파악 및 위험성 결정 방법, -위험성 감소 대책 수립시 주의하여야 할 사항 -관련 자료 공유 및 기록관리 ※상기 사항에 대한 설명 및 지도 실시		

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	절연저항측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	1.0MΩ 이상		
	측정값	1.0 MΩ	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9 %	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	조도계	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	33 Lux	적합 여부	부적합
	개선대책 (부적합 시)	해드랜턴, 투광기 설치 예정		
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-07~2026-04-08	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨
발생으로 고기압 경계가 남부와
제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심**
으로 큰비가 내릴 가능성

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양
지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에**
도달하면서 그 강도를 유지할 가능성,
최근 국내 영향 태풍은 증가세

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화
되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나**
높을 전망

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
