

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	연무장길 일대 거점정원 조성사업	사업장관리번호 (사업개시번호)	20481554986 (92601895397)
	공사기간	2026-03-03 ~ 2026-04-16	공사금액	106,899,728 원
	책임자	황병태	연락처 (이메일)	010-5334-2126 (bl1000@hanmail.net)
	주소	서울 성동구 연무장15길 11(성수동2가)외		

본사	회사명	더남마을(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101112139198 (204-81-55498)
	면허번호	중량-01-19-01	연락처	02-426-3622
	주소	서울 동대문구 답십리로 184		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-10
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	80%
횟수	(2) 회차 / 총 (3) 회	담당 요원	윤병선 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 황병태 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 나무, 식재 작업 / 작업인원 : 5명 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 해당없음 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 우천 등으로 인한 근로자 한랭질환 발생 위험 2) 현장 작업자 안전모, 안전화 등 미착용으로 인한 부상 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-10)	현장 내	트럭 적재함에서 자재 운반 시 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 2인1조 이상 작업 실시 - 작업 구간 신호수, 유도원 배치를 통한 작업 관리 - 근로자 추락방지조치 실시 ----- * 트럭 적재함 위에 보호구 미착용한 상태에서 하역 등 작업 시 추락하여 중대재해 위험 [트럭 적재함 위에 작업시 개인보호구(안전모, 안전대) 착용 후 안전고리 체결 후 작업 할 것.] - 개인보호구(안전모, 안전대) 착용 후 작업 할 것.	해당 작업 종료
2026-03-31 (2026-04-10)	현장 내	자재 보관 시 튀어나온 부분에 부딪힘 위험	[기술지도요원 강조사항] - 자재 보관 및 적재 시 정리정돈하여 보관할 것 - 튀어나온 부분은 충돌방지덮개 및 커버 설치 할 것 ----- * 작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자 충돌 위험 [작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자가 충돌 할 위험이 없도록 한다.] - 제거가 불가능 한 것일 경우, 돌출부를 덮개 등으로 감쌀 것. - 돌출부 주변 주의표지를 설치하여 근로자에게 주지 시킬 것.	해당 작업 종료
2026-03-31 (2026-04-10)	현장 내	함마드릴 등 작업 시 회전공구에 의한 손말림 위험	[기술지도요원 강조사항] - 손말림 방지 면장갑 착용 금지 - 작업 전 작업자세, 작업방법에 대한 교육 실시 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제95조(회전기계-장갑의 사용 금지)] - 사업주는 근로자가 날·공작물, 축이 회전하는 기계를 취급하는 경우 손에 밀착이 잘되는 가죽 장갑 등 손이 말려 들어갈 위험이 없는 장갑을 사용하도록 하여야 한다.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-10)	현장 내	근로자 보호구 미착용으로 인한 머리 부상 위험	[기술지도요원 강조사항] - 안전모 및 안전모 턱끈 착용 후 작업 요망 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제9 4조(안전모 착용) [안전모 안전사항] - 동력으로 작동되는 기계에 근로자 의 머리카락이 말려 들어갈 우려가 있는 경우에는 해당 근로자에게 작 업에 알맞은 안전모를 착용할 것 - 작업자는 반드시 안전모를 착용할 것 - 안전모 착용시는 턱끈 조임 및 머 리고정대 조절 등 올바르게 착용할 것	미이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	작업자 안전모, 안전화 등 미착용으로 인한 부상 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업자 안전모, 안전화 착용 후 작업 요망 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)] - 사업주는 다음 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 해야 한다. - 물체가 떨어지거나 날아올 위험, 근로자가 추락할 위험이 있는 작업: 안전모. - 높이, 깊이 2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업: 안전대. - 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임, 감전, 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업: 안전화. - 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안경. - 감전의 위험이 있는 작업: 절연용 보호구.	가능성 (2) 중대성 (2)  보통 (4) 개선 즉시 이행가능
현장 내	우천 등으로 인한 옥외 작업자 한랭질환 발생 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 주기적인 휴식시간 부여 및 스트레칭 실시 - 근로자 건강상태 수시 체크 요망 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제563조 (한랭장해 예방 조치)] - 사업주는 근로자가 한랭작업을 하는 경우에 동상 등의 건강장해를 예방하기 위하여 다음 각 조치를 하여야 한다. - 혈액순환을 원활히 하기 위한 운동지도를 할 것. - 적절한 지방과 비타민 섭취를 위한 영양지도를 할 것. - 체온 유지를 위하여 더운물을 준비할 것. - 젖은 작업복 등은 즉시 갈아입도록 할 것.	가능성 (2) 중대성 (2)  보통 (4) 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	작업구간 내 신호수 배치 상태 양호 	[기술지도요원 강조사항] - 차량, 보행자 신호수 배치 상태 양호 ----- [가설공사 표준안전 작업지침 제28조(가설도로-신호수)] - 신호수 - 책임감 있고 임무숙지 잘 훈련되고 경험있는 자로 한다.	가능성 (1)
			중대성 (1)
			 낮음(1) 필요에 따라 개선
			즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

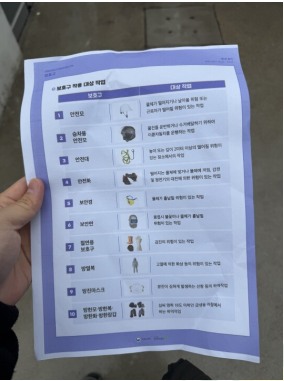
다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 시설물 옮기기 작업(애드벌룬 등)	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
시설물 옮기기 작업(애드벌룬 등)	중량물 취급 시 근로자 허리 부담 등 근골격계 질환 발생 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 근로자 건강상태 고려하여 작업 배치 - 충분한 스트레칭 실시 및 휴식시간 부여 - 인력 운반 시 대차 등 사용하여 작업방법 개선 ----- [운반하역표준안전작업지침 제10조(인력운반 하역-중량물)] - 숙련된 경험자를 작업 지휘자로 선정하여 운반방법, 운반 단계 등을 협의하여 결정. - 공동으로 중량물을 운반할 시 - 근로자의 체력, 키 등을 고려하여 현저한 차이가 있는 근로자 제외. - 공동으로 중량물을 운반할 시 - 작업지휘자의 지시에 따라 통일된 행동 수행. - 무게 중심이 높은 하물은 인력으로 운반 하지 않기.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
시설물 옮기기 작업(애드벌룬 등)	근로자 안전모 미착용으로 인한 넘어짐 및 충돌 시 머리 부상 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 안전모, 안전모턱끈 착용 후 작업 - 관리자 및 작업지휘자 상주하에 보호구 착용 상태 수시 점검 및 체크 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제94조(안전모 착용) [안전모 안전사항] - 동력으로 작동되는 기계에 근로자의 머리카락이 말려 들어갈 우려가 있는 경우에는 해당 근로자에게 작업에 알맞은 안전모를 착용할 것 - 작업자는 반드시 안전모를 착용할 것 - 안전모 착용시는 턱끈 조임 및 머리고정대 조절 등 올바르게 착용할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
시설물 옮기기 작업(애드벌룬 등)	시설물 옮기기 작업 시 차량과 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] - 신호수 및 유도원 배치 후 작업 요망 ----- [가설공사 표준안전 작업지침 제28조(가설도로-신호수)] - 신호수 - 책임감 있고 임무숙지 잘 훈련되고 경험있는 자로 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진		내용		
 	자료명칭	보호구 착용 관리		
	제공수(종류)	1	교육인원	1
	교육내용	- 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용에 관한 사항 - 분진발생 작업 시 방진마스크 착용에 관한 사항 - 안구손상 예방 보안경 착용에 관한 사항		

장비

사진	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	현장 내
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	236Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-01~2026-04-10	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성**, 최근 국내 영향 태풍은 증가세

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
