

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	성수이로 등 3개노선 가로정원 조성사업	사업장관리번호 (사업개시번호)	5487015376 (92601938467)
	공사기간	2026-03-05 ~ 2026-04-18	공사금액	414,821,730 원
	책임자	안철주	연락처 (이메일)	010-3741-9041 (cjann@naver.com)
	주소	서울 성동구 성수이로 10(성수동2가)		

본사	회사명	주식회사에이티조경	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101117457313 (545-87-01537)
	면허번호	동대문-10-16-3	연락처	02-3390-9886
	주소	서울 동대문구 장한로 119		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-16
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	95%
횟수	(2) 회차 / 총 (3) 회	담당 요원	윤병선 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 안철주 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 관수 및 식재 작업 / 작업인원 : 1명 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 해당없음 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 삽질 등 반복동작으로 인한 근로자 허리 부담 위험 2) 사각 플랜트 중량물 운반 시 자재 낙하로 맞음 위험 3) 근로자 안전모 미착용으로 인한 머리 부상 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-16)	현장 내	굴착기 운전원 안전벨트 미착용으로 인한 장비 전도 시 협착 위험	[기술지도요원 강조사항] - 굴착기 운전원 안전벨트 착용 후 작업 - 운전원은 유자격자 및 특별안전보건교육 실시 - 운전석 도어는 폐합된 상태에서 작업 실시 ----- * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제2절 굴착기 [굴착기 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조의3(굴착기-좌석안전띠의 착용)] - 작업 전 커플러 안전핀 체결 여부 확인할 것 - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것 - 충분한 노폭 확보 및 다짐 철저히 할 것 - 정지상태를 유지할 수 있는 제동장치 및 제동장금장치를 갖출 것 - 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확보할 것 - 디퍼 및 크램셀 버킷은 균열이나 손상된 곳이 없을 것 - 굴착기를 운전하는 사람은 좌석안전띠를 착용해야 한다.	해당 작업 종료
2026-03-31 (2026-04-16)	현장 내	굴착기 후방 협착방지시설 미설치로 인한 충돌, 협착 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 굴착기 육안점검 실시 - 후방카메라, 경고음, 협착방지시설 설치 후 작업 - 장비 사용 작업계획서 작성 및 수립, 서면으로 보관 - 위험성평가 실시(근로자의견 반영) ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조의2(굴착기-충돌위험 방지조치)] - 사업주는 굴착기에 사람이 부딪히는 것을 방지하기 위해 후사경과 후방영상표시장치 등 굴착기를 운전하는 사람이 좌우 및 후방을 확인할 수 있는 장치를 굴착기에 갖춰야 한다. - 사업주는 굴착기로 작업을 하기 전에 후사경과 후방영상표시장치 등의 부착상태와 작동 여부를 확인해야 한다.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-16)	현장 내	굴착기 버킷 보도블럭 방치로 인한 근로자, 보행자 이동 시 부딪힘 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업구간 신호수 배치를 통한 작업구간 통제 - 버킷 등은 별도 보관장소에 보관할 것 ----- * 굴착된 구간에 출입통제 미실시로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] - 작업지휘자를 배치하여 작업을 지휘 할 것. - 굴착기의 버킷 등에서 일정거리를 유지하고 작업에 참여 할 것. - 신호수를 배치하여 굴착기의 회전반경내에 작업근로자가 출입할 수 없도록 할 것.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	사각 플랜트 등 시설물 중량물 운반 시 자재 낙하 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 지게차 사용 중량물 운반, 양중 시 신호수 배치 철저 - 자재 양중간 주변 근로자, 보행자 통 제 철저 ----- [운반하역표준안전작업지침 제57조(지게 차-적치작업)] - 적치 장소의 가까이에서는 안전한 속 도로 줄이기. - 적치 장소에서 하물의 무너짐, 파손 등 의 위험이 없는가 확인. - 포크를 끼워 넣은 위치를 확인하고 나서 주의하여 전진한 다음 예정위치에 내리 기. - 포크는 길이의 4분의 1 이상 3분의 1 이하 정도 잡아 뿔고 다시 올려 안전하 고 바르게 쌓는 위치까지 밀어 넣고 내 리기. - 파렛트를 사용하지 않고 쌓는 경우에는 사전에 공동작업자와 전도방지 등에 대 해서 충분히 협의한 후 그 신호에 따라 신중히 진행. - 하물을 적재한 상태에서 하차하거나 운 전석 이탈하지 않기.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통 (4) 개선 즉시 이행가능
현장 내	삽질 등 반복동작으로 인한 근로자 허리 부담 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전, 중, 후 주기적인 스트레칭 실시 및 휴식시간 부여 - 근로자 건강상태 수시 체크 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제659조 (근골격계부담작업-작업환경 개선)] - 사업주는 유해요인 조사 결과 근골격계 질환이 발생할 우려가 있는 경우에 인간 공학적으로 설계된 인력작업 보조설비 및 편의설비를 설치하는 등 작업환경 개 선에 필요한 조치를 하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통 (4) 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	근로자 안전모 미착용으로 인한 넘어짐 및 충돌 시 머리 부상 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 안전모 및 안전모 턱 끈 착용 후 작업 요망 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제94조 (안전모 착용) [안전모 안전사항] - 동력으로 작동되는 기계에 근로자의 머리카락이 말려 들어갈 우려가 있는 경우에는 해당 근로자에게 작업에 알맞은 안전모를 착용할 것 - 작업자는 반드시 안전모를 착용할 것 - 안전모 착용시는 턱 끈 조임 및 머리고정대 조절 등 올바르게 착용할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
을 위험 또는 	산업안전보건 기준에 관한 규칙 제 32조(보호구의 지급 등) 1. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업 : 안전모 2. 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업 : 안전대 3. 물체의 낙하, 충격, 물체의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업 : 안전화

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

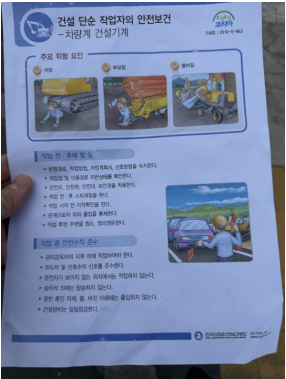
다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 뒷정리 및 청소 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
뒷정리 및 청소 작업	근로자 안전모 미착용으로 인한 넘어짐 및 충돌 시 머리 부상 위험	[기술지도요원 강조사항] - 안전모 및 안전모 턱끈 착용 후 작업 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제94조(안전모 착용) [안전모 안전사항] - 동력으로 작동되는 기계에 근로자의 머리카락이 말려 들어갈 우려가 있는 경우에는 해당 근로자에게 작업에 알맞은 안전모를 착용할 것 - 작업자는 반드시 안전모를 착용할 것 - 안전모 착용시는 턱끈 조임 및 머리고정대 조절 등 올바르게 착용할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
뒷정리 및 청소 작업	도로구간 작업 시 차량과의 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업구간 내 양방향 신호수, 유도원 배치 - 공사중임을 알리는 안내표지판 설치 ----- [도로공사 안전사항] - 작업구간 전방 200m, 100m 전 ‘공사중’ 표지판 설치할 것 - 공사현장 시종점 회전경광등 설치할 것 - 야간 시인성 확보 시설(윙카, 점멸등 등) 설치할 것 - 안전시설물 넘어지거나 움직이지 않게 고정 철저히 할 것 - 안전관리비 사용 불가항목 확인할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
---	--

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
 	자료명칭	차량계 건설기계 작업 시 안전 수칙		
	제공수(종류)	1	교육인원	1
	교육내용	- 운행경로, 작업방법, 작업계획서, 신호방법 등 숙지에 관한 사항 - 작업장 및 이동경로 지반상태 확인에 관한 사항 - 안전모, 안전화, 안전대, 보안경 등 보호구 착용에 관한 사항 - 관리감독자 및 작업지휘자 배치에 관한 사항 - 유도원 및 신호수 배치에 관한 사항		

장비

사진	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	현장 내
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	1679Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-01~2026-04-16	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
