

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	서울명신초 통합환경개선공사(장기계 속)	사업장관리번호 (사업개시번호)	20681238956 (92600097837)
	공사기간	2026-01-15 ~ 2026-05-24	공사금액	1,726,089,040 원
	책임자	공정환	연락처 (이메일)	010-9375-4606 (hkcons0628@naver.com)
	주소	서울시 종로구 낙산길 250(창신동) 서울명신초등학교		

본사	회사명	이하우징코리아(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101111909261 (206-81-23895)
	면허번호	건축공사업-01-0220	연락처	02-2202-6090
	주소	서울 송파구 가락로 33		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-15
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	85%
횟수	(7) 회차 / 총 (9) 회	담당 요원	윤병선 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 이정연 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 옥상 안전난간 설치 작업 / 작업인원 : 4명 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 휴대용 연삭기, 용접기, 고속절단기 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 단부 안전난간 설치 작업 시 근로자 추락 위험 2) 휴대용 연삭기 사용 시 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험 3) 고속절단기 사용 시 불티비산방지조치 미흡으로 인한 화재 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☒	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☒	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

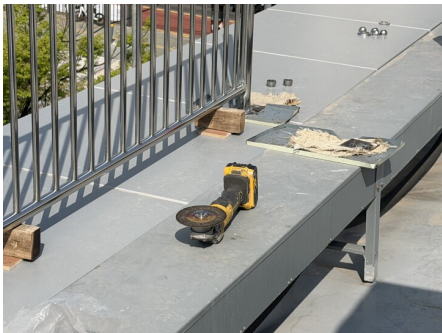
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-01 (2026-04-15)	현장 내	승강기 내부에서 작업하는 근로자 개구부 노출로 인한 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 개구부 발생 시 근로자가 떨어지지 않도록 조치할 것 - 개구부 덮개 설치 및 고정 철저 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제162조(승강기-조립 등의 작업)] - 사업주는 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망, 덮개 등의 방호 조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 한다. - 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치하여야 한다. - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시한다. - 수직형 추락방망은 한국산업표준에서 정하는 성능기준에 적합한 것을 사용해야 한다. - 사업주는 난간등을 설치하는 것이 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간등을 해체하여야 하는 경우 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 기준에 맞는 추락방호망을 설치하여야 한다. - 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락할 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 사업장에 승강기의 설치·조립·수리·점검, 해체 작업을 하는 경우 다음 각 조치를 해야 한다. - 작업을 지휘하는 사람을 선임하여 그 사람의 지휘하에 작업을 실시할 것. - 작업을 할 구역에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 취지를 보기 쉬운 장소에 표시할 것. - 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것. - 사업주는 작업을 지휘하는 사람에게 다음 각 사항을 이행하도록 하여야 한다. - 작업방법과 근로자의 배치를 결정하고 해당 작업을 지휘하는 일. - 재료의 결함 유무, 기구 및 공구의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일. - 작업 중 안전대 등 보호구의 착용 상황을 감시하는 일.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-01 (2026-04-15)	현장 내	휴대용 연삭기 사용 중 날접촉 방호 덮개 미설치로 인한 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업전 시운전을 통한 작동유무 상태 확인 - 연삭숫돌의 날접촉 방호덮개 설치 - 근로자 안전모, 보안경 등 필수 보호구 착용 철저 - 불꽃 비산 방향으로 불티비산방지조치 및 소화기 비치 후 작업 진행 - 작업 시 연삭숫돌의 측면 사용 금지 및 올바른 자세에서 작업 실시 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구 착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치	미이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	옥상 단부 안전난간 설치 작업 시 근로자 추락방지조치 미흡으로 인한 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 추락위험구간(단부 근처)에서 작업 시 별도 안전대 부착설비 설치 - 근로자 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 실시 - 고위험 작업구간 작업지휘자, 관리자 등 상주 관리 실시 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (추락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부착설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능
현장 내	휴대용 연삭기 사용 중 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업전 시운전을 통한 작동유무 상태 확인 - 연삭숫돌의 날접촉 방호덮개 설치 - 근로자 안전모, 보안경 등 필수 보호구 착용 철저 - 불꽃 비산 방향으로 불티비산방지조치 및 소화기 비치 후 작업 진행 - 작업 시 연삭숫돌의 측면 사용 금지 및 올바른 자세에서 작업 실시 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전 대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	고속절단기 사용 시 불티방지덮개 및 소화기 미배치로 인한 화재 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 불티 비산방향으로 불티비산방지덮개 설치 - 작업구간 소화기 및 방화수 비치 후 작업 - 화기 취급작업구간 화재감시자 배치 [고속절단기 사용 시 불티비산방지포를 사용하여 화재 위험 예방] - 고속절단기 사용 시 불티가 비산되는 방향으로 불티비산방지포를 설치할 것. - 고속절단기 작업 인근 소화기를 배치하여 화재를 예방 할 것. - 고속절단기 사용 시 소매 등이 말려들어가지 않도록 유의할 것. - 보안경등 을 착용하여 불꽃이 근로자 눈에 닿지 않도록 예방 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통 (4) 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	산업안전보건 기준에 관한 규칙 제 44조(안전대의 부착설비 등) 1. 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. 이러한 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 2. 사업주는 제1항에 따른 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 비계 해체 작업	4.	7.
	2. 청소 및 정리 작업	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
비계 해체 작업	외부 시스템비계 해체 작업 시 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 시스템비계 상부에서 작업 시 근로자 추락방지조치 실시 - 별도 안전대 부착설비 설치 후 작업 - 근로자 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 실시 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제57조(비계 등의 조립·해체 및 변경)] - 근로자가 관리감독자의 지휘에 따라 작업하도록 할 것. - 조립·해체, 변경의 시기·범위 및 절차를 그 작업에 종사하는 근로자에게 주지시킬 것. - 조립·해체, 변경 작업구역에는 해당 작업에 종사하는 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시할 것. - 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것. - 비계재료의 연결·해체작업을 하는 경우 폭 20cm 이상의 발판을 설치할 것. - 비계재료의 연결·해체작업을 하는 경우 근로자로 하여금 안전대를 사용하도록 하는 등 추락을 방지하기 위한 조치를 할 것. - 재료·기구, 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 근로자가 달출, 달포대 등을 사용하게 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
비계 해체 작업	외부 시스템비계 해체 작업 시 작업순서, 작업방법 등 미준수로 인한 붕괴 위험	[기술지도요원 강조사항] - 시스템비계 해체 작업계획서 수립 및 이행 - 해체 작업계획서 내 근로자 추락방지조치계획, 붕괴, 전도예방조치 계획 수립 내용 작성 - 위험성평가 실시 및 근로자 의견청취 ----- [시스템 비계 안전난간 해체 작업 시 조립 순서 준수, 안전대를 착용 하여 추락을 예방 할 것.] - 시스템 비계 안전난간 해체 전 관리감독자에게 보고 할 것. - 시스템 비계 안전난간 해체 작업 시 반드시 안전대를 지급하고 부착설비에 연결하여 작업을 진행 시킬 것. - 시스템 비계 해체 순서도를 작성하고 그에 따라 작업 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
청소 및 정리 작업	근로자 안전모 미착용으로 인한 넘어짐 및 충돌 시 머리 부상 위험	[기술지도요원 강조사항] - 안전모 및 안전모 턱끈 착용 후 작업 실시 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제94조(안전모 착용) [안전모 안전사항] - 동력으로 작동되는 기계에 근로자의 머리카락이 말려 들어갈 우려가 있는 경우에는 해당 근로자에게 작업에 알맞은 안전모를 착용할 것 - 작업자는 반드시 안전모를 착용할 것 - 안전모 착용시는 턱끈 조임 및 머리고정대 조절 등 올바르게 착용할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등		** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인,타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	비계 위에서의 안전작업	
	제공수(종류)	1	교육인원 1
	교육내용	- 2미터 이상 상부 작업 시 근로자 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 - 고위험 작업구간 관리자, 작업지휘자 상주 관리 실시 - 추락위험구간 근로자 추락방지대책 계획 수립 철저 - 위험성평가 실시 및 근로자 의견 반영 - 근로자 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업	

장비

사진		내용		
	장비명	조도계	측정 장소	현장 내
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	1348Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-02~2026-04-15	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
