

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	소공동 112-4,5 리모델링 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	111-81-17606-6 (925-12-25005-7)
	공사기간	2025-10-13 ~ 2026-04-30	공사금액	1,006,500,000 원
	책임자	강효정	연락처 (이메일)	010-9497-7462 (tjtgk4@naver.com)
	주소	서울 중구 세종대로18길 32 (소공동)		

본사	회사명	(주)경동하우징	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-0650922 (111-81-17606)
	면허번호	은평 2017-11-1	연락처	023561277
	주소	서울시 영등포구 양평로5 성원빌딩7층		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-15
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	78%
횟수	(10) 회차 / 총 (10) 회	담당 요원	윤병선 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 강효정 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 장애인편의시설 벽체 E/V 취부, 청소 작업 / 작업인원 : 5명 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 휴대용 연삭기 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 휴대용 연삭기 사용 시 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험 2) 이동전선 바닥 방치로 인한 걸려 넘어짐 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-01 (2026-04-15)	현장 내	시스템비계 상부에서 작업 시 안전대 미착용 및 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 시스템비계 상부에서 작업 시 근로자 안전대 지급 및 착용 - 근로자는 안전대를 착용하고 안전고리 체결 후 작업 실시 - 별도 안전대 부착설비 설치 후 작업 진행 - 내측, 외측 안전난간 및 작업발판 임의해체 금지 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부착설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	해당 작업 종료
2026-04-01 (2026-04-15)	현장 내	휴대용 연삭기 사용 중 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업전 시운전을 통한 작동유무 상태 확인 - 연삭숫돌의 날접촉 방호덮개 설치 - 근로자 안전모, 보안경 등 필수 보호구 착용 철저 - 불꽃 비산 방향으로 불티비산방지조치 및 소화기 비치 후 작업 진행 - 작업 시 연삭숫돌의 측면 사용 금지 및 올바른 자세에서 작업 실시 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구 착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지	미이행

위험성평가(3레벨-3x3단계)

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

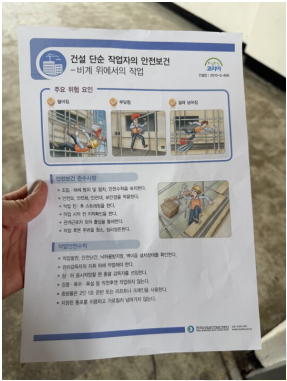
다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 곤돌라 해체 작업	4.	7.
	2. 준공 청소 작업	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
곤돌라 해체 작업	곤돌라 해체 작업 시 자재낙하 및 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 해체 작업계획서 수립 및 이행 - 작업구간 상, 하부 신호수, 유도원 배치를 통한 통제 철저 - 작업순서, 작업방법 등 근로자 내용 공유(위험성평가 실시) - 상부 작업자 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제160조(곤돌라-운전방법 등의 주지)] - 사업주는 곤돌라의 운전방법, 고장이 났을 때의 처치방법을 그 곤돌라를 사용하는 근로자에게 주지시켜야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
준공 청소 작업	달비계 탑승 시 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 달비계 작업 시 주로프, 보조로프 설치 후 작업 실시할 것 - 근로자는 건물 내부에서 로핑에 안전고리 체결 후 넘어갈 것 - 작업 전 근로자 안전벨트, D링 등 착용 상태 확인 철저 - 상, 하부 근로자, 보행자 통제 및 신호수, 유도원 배치 - 2점지지 로프 고정 철저(폴림방지를 위한 시건 철저) ----- * 달비계 작업 시 옥상 등에 감시자를 배치하여 로프의 훼손 등을 방지할 것 [달비계 작업 시 로프 훼손 방지 등을 위한 감시자 배치] - 옥상에 감시자를 배치하여 로프의 훼손등을 예방 할 것. - 작업 전 TBM, 교육을 통해 달비계 사용 안전작업 수칙 전파 할 것. - 로프의 점검을 통해 이상 시 교체하고 수시로 점검 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	비계 위에서의 안전작업		
 	제공수(종류)	1	교육인원	1
	교육내용	- 시스템비계 상부에서 작업 시 하부로 떨어지는 자재 등 구간에는 출입 통제를 철저히 할 것 - 신호수나 유도원을 배치하여 출입 통제 요망 - 출입금지, 공사중 입간판 등을 설치하여 보행자 우회 유도 - 근로자 안전대 부착설비 설치 및 안전고리 체결 후 작업		

장비

사진 	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	현장 내
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	209Lux	적합 여부	적합
	비고			
사진 	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
사진 	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-02~2026-04-15	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
