

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서


담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	역삼동 788-10 휴롬엘에스사옥 인테리어공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	184-87-00634-6 (926-03-80119-7)
	공사기간	2026-04-06 ~ 2026-06-30	공사금액	1,430,000,000 원
	책임자	김기환	연락처 (이메일)	010-3099-4431 (b@zero-to-n.com)
	주소	서울시 강남구 도곡로 205		

본사	회사명	제로투엔건축사사무소종합건설(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-6495992 (184-87-00634)
	면허번호	01-4082	연락처	
	주소	서울시 강남구 봉은사로 151, 701호		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-10
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	3%
횟수	(1) 회차 / 총 (5) 회	담당 요원	김정훈 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8769-2234
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김기환 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	- 현재 내구재 철거 및 반출공사 작업 중 (작업인원 : 10명 / 장비 : 없음 / 위험기계기구 : 이동식사다리, 핸드그라인더 / 유해위험물질 : 없음) - 금일작업의 주요 위험요인 - 이동식사다리 작업 시 전도방지 미조치로 인한 추락재해위험 - 핸드그라인더 방호장치 미설치로 인한 비래 및 베임재해위험 - 철거작업 중 발생하는 분진흡입으로 인한 호흡기질환 발생위험 - 화기사용 작업 시 화재 발생위험 - 산업안전보건관리비 : 월별 사용 내역서 작성 및 목적외 사용 금지 지도 - 산업재해 발생 여부 : 없음		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항
12대 기인물	☐ 1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐ 2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐ 3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐ 4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐ 5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작동 확인	☐ 6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒ 7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐ 8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명줄, 작업줄)
	☐ 9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐ 10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐ 11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐ 12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하부 출입통제
기타	☒ 13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐ 14. 그 밖의 위험요인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법								
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
7층	천정마감재 철거 이동식사다리 작업 시 전도방지 미조치로 인한 추락재해위험 	[기술지도요원 강조사항] - 이동식사다리 핵심 안전수칙 • 미끄럼 방지 및 전도방지조치(아우트리거 펼침 또는 2인1조 작업) • 평탄하고 견고한 바닥에 설치 • 바닥면에서 높이 3.5m 이하의 장소에서만 사용 • 작업 높이가 2m 이상인 경우 안전모와 안전대를 함께 착용할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지) [사다리 안전사항] - 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 - 작업발판으로 사용을 지양하고 수직 이동통로 시설로 사용을 한정할 것 - 손, 발, 무릎 등 사용하여 3점 접촉 상태를 유지할 것 - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업실시할 것 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2) 중대성 (2)  보통 (4) 개선 즉시 이행가능
3, 7층	철거작업 중 발생하는 분진흡입으로 인한 호흡기질환 발생위험 (분진흡입기 설치함) 	[기술지도요원 강조사항] - 철거공사 근로자에게 분진마스크 등 호흡용 보호구를 지급하고 착용토록할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제9장 분진에 의한 건강장해의 예방 [분진 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제607조 (분진 작업-국소배기장치의 설치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제617조 (분진 작업-호흡용 보호구의 지급 등)] - 살수설비나 주유설비를 갖추고 물을 뿌리거나 주유를 하면서 분진이 흩날리지 않도록 작업할 것 - 분진작업을 하는 실내작업장에 대하여 매일 작업을 시작하기 전에 청소할 것 - 근로자에게 호흡용 보호구를 지급하여 착용하도록 할 것 - 분진을 줄이기 위하여 밀폐설비나 국소배기장치를 설치할 것	가능성 (2) 중대성 (2)  보통 (4) 개선 조치완료

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
3층	핸드그라인더 방호장치 미설치 사용 시 비래 및 베임재해위험 	[기술지도요원 강조사항] - 핸드그라인더 방호장치 임의해제 금지할 것 - 핸드그라인더 사용 시 분진마스크, 보안경 등 개인보호구를 착용하고 작업용콘센트 접지상태 확인 할 것 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전 대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능
3, 7층	화기사용 작업 시 불티비산에 의한 화재 위험 (소화기 및 소방수 설치 양호함) 	[기술지도요원 강조사항] - 화기사용 작업 시에는 불티비산방지막 설치 등 화재예방 조치 및 화재감시자 배치할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제245조 (화기사용 장소의 화재 방지)] - 사업주는 흡연장소 및 난로 등 화기를 사용하는 장소에 화재예방에 필요한 설비를 하여야 한다. - 화기를 사용한 사람은 불티가 남지 않도록 뒤처리를 확실하게 하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (1)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선 조치완료
3층	면장갑 착용 상태로 전동드라이버 등 회전기계 사용 시 손가락 부상위험 	[기술지도요원 강조사항] - 전동드라이버 등 회전축이 있는 전동공구 사용 중 면장갑이 말려들어가 손가락 부상위험이 있으므로 면장갑 착용을 지양하고 밀착장갑 또는 맨손 작업토록할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제95조 (회전기계-장갑의 사용 금지)] - 사업주는 근로자가 날·공작물, 축이 회전하는 기계를 취급하는 경우 손에 밀착이 잘되는 가죽 장갑 등 손이 말려 들어갈 위험이 없는 장갑을 사용하도록 하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
3층	가설분전함 설치상태 불량 시 감전재해 위험 (누전차단기 설치 및 접지상태 양호함) 	[기술지도요원 강조사항] - 관리책임자 지정 및 게시하여 관리하고 수시로 접지상태를 확인할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조 (누전차단기에 의한 감전방지) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조 (전기 기계 · 기구 등의 충전부 방호) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조 (전기 기계 · 기구의 접지) [분전반 누전차단기 안전사항] [분전반 방호 안전사항] [분전반 접지 안전사항] - 해당 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치할 것 - 모든 전원은 누전차단기를 경유하여 사용할 것 - 사용 전에 누전차단기의 상태를 점검하고 이상이 발견 시 보수하거나 교환할 것 - 누전차단기는 분전반 내에 접속하거나 꽂음접속기형 누전차단기를 콘센트에 접속하는 등 파손이나 감전사고를 방지할 수 있는 장소에 접속할 것 - 충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형 외함이 있는 구조로 할 것 - 분전반 시건장치하여 관리할 것 - 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 접지를 실시할 것	가능성 (2)
			중대성 (1)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선 조치완료

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

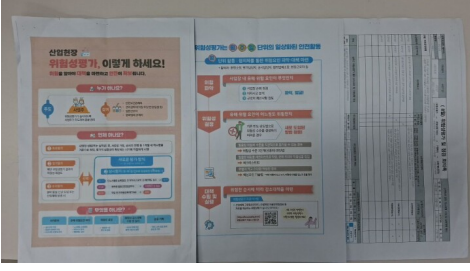
다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 실내인테리어공사	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
실내인테리어공사	금속공사 고속절단기 사용 시 불티비산에 의한 화재위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업장 주변의 가연물 격리조치 및 소화기 비치하고 화재감시자 배치할 것 ----- * 위험기계·기구 방호조치 기준 제5장 금속절단기 [고속절단기 사용 안전대책] - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 크랭크핸들 부착 사용 - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 소화기 비치 - 케이블의 피복손상 유무 확인	가능성 (2)
			중대성 (1)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선
실내인테리어공사	이동식사다리 작업 시 전도방지 미조치로 인한 추락재해위험	[기술지도요원 강조사항] - 이동식사다리 핵심 안전수칙 • 미끄럼 방지 및 전도방지조치(아우트리거 펼침 또는 2인1조 작업) • 평탄하고 견고한 바닥에 설치 • 바닥면에서 높이 3.5m 이하의 장소에서만 사용 • 작업 높이가 2m 이상인 경우 안전모와 안전대를 함께 착용할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] - 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 - 작업발판으로 사용을 지양하고 수직 이동통로 시설로 사용을 한정할 것 - 손, 발, 무릎 등 사용하여 3점 접촉 상태를 유지할 것 - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업실시할 것 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
 	자료명칭	- 위험성평가 이렇게 하세요!	
	제공수(종류)	1	교육인원 1
	교육내용	- 위험성평가는 원 · 하청 안전보건관계자가 함께 협의체 회의를 겸한 월-주-일 단위의 일상화된 안전활동 (위험성평가 표 작성-위험성평가 회의-이행확인-교육, TBM 전파) - 위험성평가 결과를 근로자에게 공유 - 모든 과정은 기록, 보관해야 함	

장비

사진	내용		
	장비명	가스농도측정기	측정 장소 3층
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만	
	측정값	0ppm	적합 여부 적합
	비고		
	장비명	산소농도측정기	측정 장소 3층
	측정 기준	18%이상 23.5%미만	
	측정값	20.9%	적합 여부 적합
	비고		
	장비명	접지테스터기	측정 장소 3층 가설분전함
	측정 기준	여부	
	측정값	접지양호	적합 여부 적합
	비고		

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-06~2026-04-09	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
