

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장


현장	현장명	독산동 산업문화어울림센터 건설공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	610-81-37088-6 (924-14-38374-7)
	공사기간	2024-12-30 ~ 2026-10-02	공사금액	8,928,053,000 원
	책임자	문사호	연락처 (이메일)	010-3566-4995 (sunganct@daum.net)
	주소	서울 금천구 독산동 331-38		

본사	회사명	성안건설(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	230111-0059450 (610-81-37088)
	면허번호	07-0020	연락처	052-876-770
	주소	울산 북구 명촌8길 22		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-24
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	39%
횟수	(28) 회차 / 총 (40) 회	담당 요원	윤병선 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 문사호 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	* 공사개요 작업현재공정 : 타설 작업 / 작업인원 : 11명 건설기계장비 : 타워 크레인, 펌프카 / 유해 위험기구 : 해당없음 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 부상1건 *주요 위험 요인 1) 타설 작업자 추락위험구간에서의 추락방지조치 상태 미흡으로 추락 위험 2) 펌프카, 레미콘 사이 충돌방지스토퍼 미설치로 인한 충돌, 협착 위험 3) 철근 이동구간 실족방지망 미설치로 인한 발빠짐 위험		

전경사진

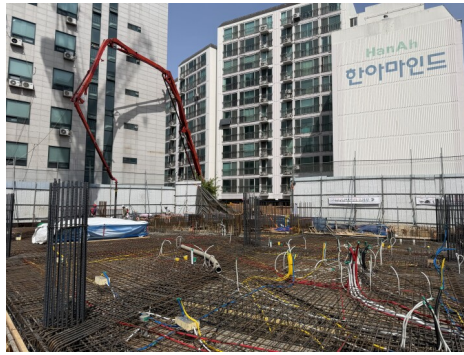

건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-09 (2026-04-24)	현장 내	동바리 정리 작업 시 작업발판 설치 불량으로 인한 추락, 넘어짐 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업발판 설치가 곤란한 경우, 이동식사다리, 말비계 등 사용 요망(설치 요건에 맞게 안전하게 설치 후 작업) - 말비계를 기울여서, 뒤집어서 사용 금지 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제9조(작업발판 등) [작업발판 안전사항] - 발판재료는 작업할 때의 하중을 견딜 수 있도록 견고한 것으로 할 것 - 작업발판 폭은 40cm이상, 발판재료 간의 틈은 3cm이하로 할 것 - 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것 - 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용할 것 - 작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시킬 것 - 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 경우에는 위험 방지에 필요한 조치를 할 것 - 기계·설비가 근로자의 신체조건에 맞지 않는 경우 작업발판을 설치하거나 기계·설비 높이를 조절할 것	해당 작업 종료
2026-04-09 (2026-04-24)	현장 내	계단실 구간 철근 찢림방지조치 미흡 으로 인한 찢림, 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] - 돌출 철근 철근보호캡 설치 요망 ----- * 배근된 철근에 의해 근로자 베임, 찢림 사고 위험 [철근보호캡 등을 이용하여 돌출된 철근에 의해 찢림, 베임 사고 예방 할 것] - 철근보호캡 등을 이용하여 돌출된 철근 보호 - 작업 전 돌출된 철근 확인 및 근로자 주지시킬 것 - 돌출된 철근이 있는 곳일 경우 넘어가거나 뛰어다니지 말 것	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-09 (2026-04-24)	현장 내	T/C 자재 양중 시 전용 인양함 미사용으로 인한 낙하 재해 발생 위험	[기술지도요원 강조사항] - 자재 양중 시 전용 인양함 사용 후 인양, 운반 할 것 - 인양 시 하부 근로자 통제 및 접근 금지조치 실시 - 신호수, 유도원 배치 후 작업 실시 ----- * 중량물 인양 작업시 작업공간 내부에 근로자 출입으로 인해 협착, 맞음 위험 [중량물 인양 작업 시 작업공간 내부에 출입하지 않고 외부에서 작업을 지휘할 것.] - 작업지휘자를 배치하여 전체 작업을 지휘하고 통제할 것. - 인양물(중량물)이 흔들림을 방지하기 위해 줄걸이상태 및 2줄걸이로 인양 할 것. - 중량물과 근로자가 근접하게 있지 않도록 할 것. - 중량물작업계획서를 작성하고 계획서를 이행 할 것. - 중량물 인양작업에 투입되는 근로자에게 중량물인양에 관한 교육을 실시 할 것.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준			개선방법											
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3			6~9			높음			즉시 개선		
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2			3~4			보통			개선		
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1			1~2			낮음			필요에 따라 개선		

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	타설 작업자 추락위험구간에서의 타설 작업 중 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 추락 위험이 있는 단부 근처에서 작업 시 근로자 추락방지조치 요망 - 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용, 안전고리 체결 후 작업 실시 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (추락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능
현장 내	펌프카, 레미콘 사이 충돌방지스토퍼 미설치로 인한 충돌, 협착 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 펌프카와 레미콘 사이 충돌방지 스토퍼 설치 및 후사경 설치 후 작업 요망 - 작업구간 신호수, 유도원 배치 ----- [콘크리트공사표준안전작업지침 제14조 (콘크리트 타설-펌프카)] - 레디믹스트 콘크리트(이하 레미콘이라 함.) 트럭과 펌프카를 적절히 유도하기 위하여 차량안내자 배치. - 펌프배관용 비계 사전점검하고 이상이 있을 시 보강 후 작업. - 펌프카의 배관상태 확인. - 레미콘트럭과 펌프카와 호스선단의 연결 작업 확인. - 호스선단이 요동하지 아니하도록 확실히 붙잡고 타설. - 장비사양의 적정호스 길이 초과하지 않기. - 공기압송 방법의 펌프카 사용 시 콘크리트가 비산하는 경우가 있으므로 주의하여 타설. - 펌프카의 붐대 조정 시 주변 전선 등 지장물을 확인하고 이격 거리 준수. - 아웃트리거를 사용 시 지반의 부동침하로 펌프카가 전도되지 않게 하기. - 펌프카의 전후에는 식별이 용이한 안전 표지판 설치.	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	철근 상부 이동 시 근로자 발빠짐 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 철근 상부 근로자 안전통로 확보 요망(실족방지망 설치) ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(작업장-전도의 방지)] - 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지해야 한다. - 사업주는 제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 해야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 거푸집 조립 및 설치 작업	4.	7.
	2. 철근배근 작업	5.	8.
	3. 타설 작업	6.	9.


진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
거푸집 조립 및 설치 작업	타워크레인으로 보 인양 시 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] 인양 시 간섭 구조물 사전 확인 및 양중 방법, 순서 등 교육 실시 바랍니다. - 작업구간 통제 철저 요망 ----- * 중량물 인양 작업시 작업공간 내부에 근로자 출입으로 인해 협착, 맞음 위험 [중량물 인양 작업 시 작업공간 내부에 출입하지 않고 외부에서 작업을 지휘할 것.] - 작업지휘자를 배치하여 전체 작업을 지휘하고 통제할 것. - 인양물(중량물)이 흔들림을 방지하기 위해 줄길이상대 및 2줄걸이로 인양 할 것. - 중량물작업계획서를 작성하고 계획서를 이행 할 것.	가능성 (3)
			중대성 (3)
			 높음(9) 즉시 개선
철근배근 작업	철근배근 작업 시 말비계 등 작업발판 사용으로 인한 전도 및 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] <말비계> - 낙상경보장치 설치 및 끝단부에 서서 작업 금지 - 작업발판 폭 40cm이상 확보 요망 - 경사로에서 작업 금지 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)] - 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것. - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것. - 말비계의 높이가 2m를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철근 배근 작업	근로자 안전고리 미체결 상태에 서 작업 중 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 진행 - 작업 순서, 작업 방법 등 자세한 작업내 용을 근로자에게 전달 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추 락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상 의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있 는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부속설비의 이상 유무 를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
타설 작업	펌프카, 레미콘 등 장비 사용 시 충돌, 협착 위험	[기술지도요원 강조사항] - 운행경로, 작업방법, 작업계획서, 신호 방법 등 숙지 - 작업장 및 이동경로 지반상태 확인 및 아우트리거 100% 확장 - 안전모, 안전화, 안전대, 보안경 등 보 호구 착용 - 관리감독자 및 작업지휘자 배치 - 유도원 및 신호수 배치, 펌프카와 레미 콘 사이 충돌방지 스톱퍼 설치 ----- [콘크리트공사표준안전작업지침 제14조(콘크 리트 타설-펌프카)] - 레디믹스트 콘크리트(이하 레미콘이라 함.) 트럭과 펌프카를 적절히 유도하기 위하여 차량안내자 배치. - 펌프배관용 비계 사전점검하고 이상이 있을 시 보강 후 작업. - 펌프카의 배관상태 확인. - 레미콘트럭과 펌프카와 호스선단의 연결작 업 확인. - 장비사양의 적정호스 길이 초과하지않기. - 호스선단이 요동하지 아니하도록 확실히 불 잡고 타설. - 공기압송 방법의 펌프카 사용 시 콘크리트 가 비산하는 경우가 있으므로 주의하여 타 설. - 펌프카의 붐대 조정 시 주변 전선 등 지장 물을 확인하고 이격 거리 준수. - 아우트리거를 사용 시 지반의 부동침하로 펌프카가 전도되지 않게 하기. - 펌프카의 전후에는 식별이 용이한 안전표지 판 설치.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

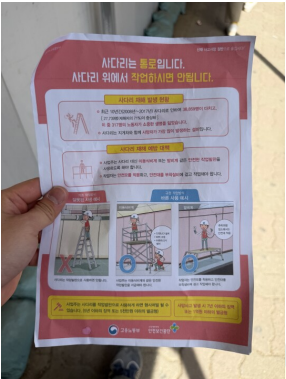사진	내용		
 	자료명칭	사다리 사용 시 안전 수칙	
	제공수(종류)	1	교육인원 1
	교육내용	- 작업발판으로 사용을 지양하고 이동용으로만 사용 - 말비계, 이동식비계 등 작업발판 사용이 곤란한 경우 협소한 공간에서만 사다리 사용 - 협소한 공간 내에서 2인1조 이상 작업 준수 - 최상단 발판은 사용을 금지하며, 흔들림 없이 고정 조치 할 것	

장비

사진	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	현장 내
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	1870Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-10~2026-04-24	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 · 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 · 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 · 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
