

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	서울성모병원 4층 진단검사의학과 환경개선(건축)공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	21488448476 (92601884827)
	공사기간	2026-03-12 ~ 2026-06-11	공사금액	489,900,000 원
	책임자	황경상	연락처 (이메일)	010-9002-3092 (21200035@cef.or.kr)
	주소	서울 서초구 반포대로 222		

본사	회사명	(주)평화종합건설	법인등록번호 (사업자등록번호)	11011141448222 (214-88-44847)
	면허번호	01-2327	연락처	02-2258-8499
	주소	서울 서초구 반포대로 22		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-09
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	28%
횟수	(2) 회차 / 총 (6) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607

현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 황경상 / 서명 )		
	☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		

기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 천정 작업, 경량 / 작업인원 : 2명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 전동 드릴, 그라인더 유해위험물질 : 해당 없음 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 사다리 작업 시 근로자 추락, 전도 위험 등 2) 상부, 고소 작업 시 자재, 공구 이탈로 인한 낙하 위험 3) 작업장 이동통로 등 전선 바닥 거치로 인한 전도, 누전 위험 4) 자재 인력 운반, 양중 시 근골격계 질환 위험
---------	--

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

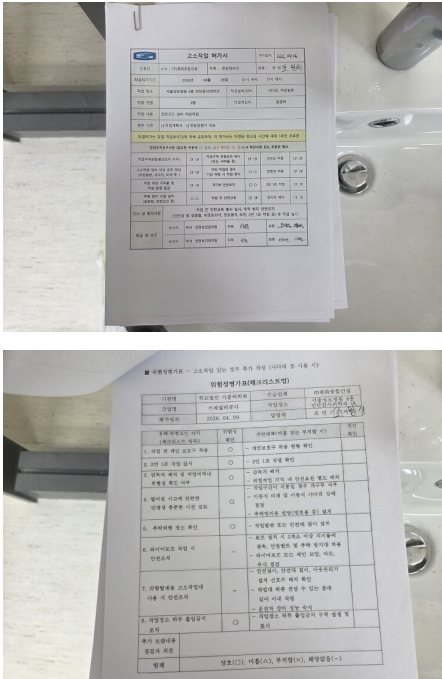
3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-20 (2026-04-10)	실내 작업 구 간(4층)	사다리 작업 시 근로자 추락, 전도 위험	[기술지도요원 강조사항] -사다리 작업 시 아웃 트리거 설치 및 확장 하여 전도 위험 예방 -단독 작업 금지 및 관리자 상주 -상부 작업시 안전대 착용 및 안전 고리 체결 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2 4조(사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조 (이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조 (사다리 작업)] - 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접 혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등 을 사용하여 견고하게 조치할 것 - 손, 발, 무릎 등 사용하여 3점 접 촉 상태를 유지할 것 - 사다리를 다리처럼 사용 금지. - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작 업실시할 것 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	이행
2026-03-20 (2026-04-10)	실내 작업 구 간	작업 구간 개구부로 인한 근로자 전 도 위험 등 (추락x)	[기술지도요원 강조사항] - 개구부 방호조치는 양호 하나, 고정조치 필요 함 - 해당 위험성 교육 및 위험성 평 가 반영 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제4 3조(개구부 등의 방호 조치) [개구부 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43 조(추락-개구부 등의 방호 조치)] [개구부 안전사항, 산업안전보건기준 에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등 의 방호 조치)] - 근로자가 추락 위험 장소에는 안전 난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방호 조치 등 설치할 것 - 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히 거나 떨어지지 않도록 설치할 것 - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도 록 개구부임을 표시할 것 - 난간등을 설치불가할 경우 추락방 호망 설치할 것	이행



지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-20 (2026-04-10)	실내 작업 구 간	이동 전선 바닥 거치로 인한 전도, 감전 위험	[기술지도요원 강조사항] 작업 구간, 이동 구간 상부로 이격 시킬 것. 접지상태 및 차단기 이상유무 점검 할 것. 해당 전선 절연상태 점검 할 것. ----- * 액체 등 도전성이 높은 습윤한 장 소에서 이동전선 사용 시 충분한 절 연 조치를 하지 않아 감전 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3 15조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3 13조(배선 등의 절연피복 등) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3 04조(누전차단기에 의한 감전방지) [이동전선 누전차단기 안전사항] [이동전선 절연피복 안전사항] [이동전선 설치 장소 안전사항] [이동전선의 경우 충분한 절연조치를 한 후 거치할 것] - 전로의 정격에 적합하고 감도가 양 호하며 확실하게 작동하는 감전방 지용 누전차단기를 설치할 것 - 사용하기 전 누전차단기 작동상태 를 점검하고 이상이 발견되면 즉시 보수하거나 교환할 것 - 통로바닥에 전선 또는 이동전선등 을 설치하여 사용하지 말 것	이행

위험성평가(3레벨-3x3단계)

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	작업 전 근로자 안전교육 미 실시로 인한 사고 위험 예방 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 내용 근로자 교육 실시 근거 없음 - 작업 전 근로자 안전교육 진행 및 위험성평가 작성 시 참여 시킬 것 ----- [산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)] - 사업주는 찾아낸 유해·위험요인 평가 시 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 작업장의 근로자를 참여 시켜야 한다. - 사업주는 찾아낸 유해·위험요인 평가의 결과와 조치사항을 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 기록하여 보존하여야 한다. - 찾아낸 유해·위험요인 평가의 방법, 절차 및 시기, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부장관이 정하여 고시한다. - 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아낸다. - 찾아낸 유해·위험요인 - 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위를 초과하는 유해·위험 요인을 찾아낸다. - 찾아낸 유해·위험요인 - 평가결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치하기. - 찾아낸 유해·위험요인 - 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치하기.	가능성 (2) 중대성 (2)  보통 (4) 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
<재해사례> 	재해내용 : 지식산업센터 기계.소방 공사 현장에서 소화배관 설치 실측을 위해 배관공이 이동식 사다리를 올라가다 1.7m 높이에서 떨어져 치료 중 사망 예방대책 : 평탄, 견고하고 미끄럼이 없는 바닥에서 2인1조로 작업하고 안전모를 반드시 착용합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 수장 공사	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
수장 공사	고소, 상부 작업 시 안전고리 미 체결로 인한 근로자 추락 위 험	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 안전고리 체결 후 작업 시작 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락 의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추 락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조(안전 대의 사용)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등 에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방 법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란 한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하 기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이 상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착 용할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
수장 공사	자재 절단,가공 작업시 화재, 폭발 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 인근 인화성 물질 제거 확인 할 것 -불티 방지포, 소화기 배치 하여 화재 예방. -단독 작업 금지 , 관리자 상주 할 것 -비상 상황 시 대처 방법 교육 후 작업 시작 할 것 ----- * 조적작업에 사용하는 유해화학물질에 의한 화재,폭발 위험 * 불꽃에 의한 화재,폭발 예방불티비산방지커버 사용 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2(화재감시자) [용접·용단 작업 화재감시자 안전사항] [화재 안전사항] [불꽃이 생기는 작업, 용접 등 작업을 할 경우 불티에 의한 화재,폭발을 방지해야 한다.] [유해화학물질 사용 시 화재,폭발에 의한 안전예방 대책을 강구 할 것.] - 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우, 작업공간 내에 소화설비(소화기)를 설치할 것. - 유해화학물질 취급 사업장 내에 소화기를 배치 할 것. - 작업전 근로자에게 유해화학물질 취급에 관한 안전규칙을 교육 할 것. - 유해화학물질에 의한 안전예방을 위해 적절한 보호구를 지급하고 착용할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인,타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	--

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	건설현장 12대 사망사고 기인물		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	사다리 관련 교육 진행		

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고	종합안전(1)		

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-20~2026-04-09	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨
발생으로 고기압 경계가 남부와
제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심**
으로 큰비가 내릴 가능성

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양
지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에**
도달하면서 그 강도를 유지할 가능성,
최근 국내 영향 태풍은 증가세

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화
되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나**
높을 전망

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
