

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	중수(지하수)처리시설 설치(신설)공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	229-81-16626-6 (926-00-90845-7)
	공사기간	2026-02-02 ~ 2026-04-30	공사금액	522,300,000 원
	책임자	김재학	연락처 (이메일)	010-3756-7637 (gkc@gakyung.com)
	주소	서울시 송파구 송파대로 55		

본사	회사명	(주)가경코스모	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-0871320 (229-81-16626)
	면허번호	송파-12-10-05	연락처	02-430-1301
	주소	서울시 송파구 위례순환로 478, 201-206호		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-23
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	98%
횟수	(5) 회차 / 총 (5) 회	담당 요원	김정훈 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8769-2234
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김재학 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	- 현재 시운전 작업 중(작업인원 : 3명 / 장비 : 없음 / 위험기계기구 : 이동식 사다리 / 유해위험물질 : 없음) - 금일작업의 주요 위험요인 · 이동식사다리 작업 시 전도방지 미조치로 인한 추락재해위험 · 시운전 근로자 안전모 미착용으로 인한 부딪힘 재해위험 · 전기기계 충전부 방호 미조치로 인한 감전재해위험 · 근로자 작업장 이동시 전도재해위험 - 산업안전보건관리비 : 월별 사용 내역서 작성 양호함 (목적외 사용 금액 없음) - 산업재해 발생 여부 : 없음		



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치						
구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☒	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☒	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
해당사항 없음				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
지하1층	배관 점검 이동식사다리 사용 시 전도방지 미조치로 인한 추락재해위험 	[기술지도요원 강조사항] - 이동식사다리 핵심 안전수칙 • 미끄럼 방지 및 전도방지조치(아우트리거 펼침 또는 2인1조 작업) • 평탄하고 견고한 바닥에 설치 • 바닥면에서 높이 3.5m 이하의 장소에서만 사용 • 작업 높이가 2m 이상인 경우 안전모와 안전대를 함께 착용할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지) [사다리 안전사항] - 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 - 작업발판으로 사용을 지양하고 수직 이동통로 시설로 사용을 한정할 것 - 손, 발, 무릎 등 사용하여 3점 접촉 상태를 유지할 것 - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업 실시할 것 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통 (4) 개선 즉시 이행가능
지하1층	근로자 통행 시 작업장 내 개구부로 추락재해위험 (덮개설치 양호함) 	[기술지도요원 강조사항] - 개구부 덮개 고정조치 철저 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조 (개구부 등의 방호 조치) [개구부 안전사항] - 근로자가 추락 위험 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방호 조치 등 설치할 것 - 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치할 것 - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시할 것	가능성 (1)
			중대성 (3)
			 보통 (3) 개선 조치완료

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
지하1층	근로자 이동 시 배관 돌출부에 걸려 전 도사고 발생위험(건널목 편널 설치 양호 함) 	[기술지도요원 강조사항] - 바닥 요철 부위는 보호 덮개를 설치 하고 식별이 용이하도록 밝은색으로 칠 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(작 업장-전도의 방지)] - 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거 나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업 장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지해야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 조치완료
지하1층	배전반 충전부 방호조치 미조치 시 감전 재해위험(폐쇄형 외함 설치 양호함) 	[기술지도요원 강조사항] - 근로자의 감전위험을 방지하기 위하 여 개폐되는 문, 경첩이 있는 패널을 견고하게 고정할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조 (전기 기계·기구 등의 충전부 방호)] - 사업주는 근로자가 작업이나 통행 등으 로 인하여 전기기계, 기구, 전로 등의 충전부분에 접촉하거나 접근함으로써 감 전 위험이 있는 충전부분에 대하여 방호 하여야 한다. - 충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형 외함 이 있는 구조로 할 것. - 충전부에 충분한 절연효과가 있는 방호 망이나 절연덮개를 설치할 것. - 사업주는 근로자의 감전위험을 방지하기 위하여 개폐되는 문, 경첩이 있는 패널 등을 견고하게 고정시켜야 한다. - 충전부는 내구성이 있는 절연물로 완전 히 덮어 감쌀 것.	가능성 (1)
			중대성 (1)
			 낮음(1) 필요에 따라 개선 조치완료
지하1층	시운전 작업 시 교육 및 작업방법 미숙 지로 인한 사고위험 	[기술지도요원 강조사항] - 시운전 시작 전 근로자 배치 및 교 육, 작업방법, 방호장치 등 필요한 사 항을 미리 확인할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제89조 (기계 운전 시작 전 조치)] - 사업주는 기계의 운전을 시작할 때 근로 자 배치 및 교육, 작업방법, 방호장치 등 필요한 사항을 미리 확인한 후 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 해야 한 다. - 사업주는 기계의 운전을 시작하는 경우 일정한 신호방법과 해당 근로자에게 신 호할 사람을 정하고, 신호방법에 따라 그 근로자에게 신호하도록 해야 한다.	가능성 (1)
			중대성 (1)
			 낮음(1) 필요에 따라 개선 조치완료

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

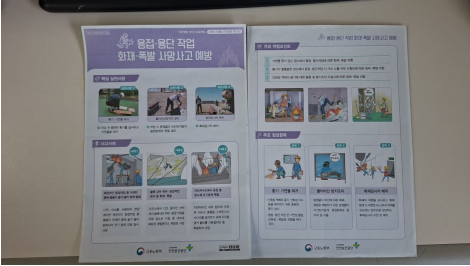
다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 공사 종료	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	- 용접·용단 작업 화재·폭발 사망사고 예방	
 	제공수(종류)	1	교육인원
	교육내용	- 작업 전 충분한 환기 실시 및 가연물 제거 - 작업 시 용접불티 비산방지 덮개, 용접방화포 등 설치 - 화재감시자 배치	
1		1	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-09~2026-04-22	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
