

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	양재동 8-34 대수선 및 증축공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	11181176066 (92514189247)
	공사기간	2025-12-03 ~ 2026-06-15	공사금액	819,500,000 원
	책임자	홍부의	연락처 (이메일)	01036628035 (skycoat@naver.com)
	주소	서울 서초구 바우뎬로39길 88-13		

본사	회사명	(주)경동하우징	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-0650922 (111-81-17606)
	면허번호	은평 2017-11-1	연락처	023561277
	주소	서울시 영등포구 양평로5 성원빌딩7층		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-20
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	55%
횟수	(8) 회차 / 총 (11) 회	담당 요원	윤병선 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 홍부의 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 외부 창호, 지하 천정 단열재, 승강기 작업 / 작업인원 : 18명 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 휴대용 연삭기, 용접기 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 단부 근처에서 사다리 작업 중 근로자 추락 위험 2) 용접 작업 시 불티비산방지조치 미흡으로 인한 화재 위험 3) 휴대용 연삭기 사용 시 날접촉방호덮개 미설치로 인한 베임 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☒	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☒	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

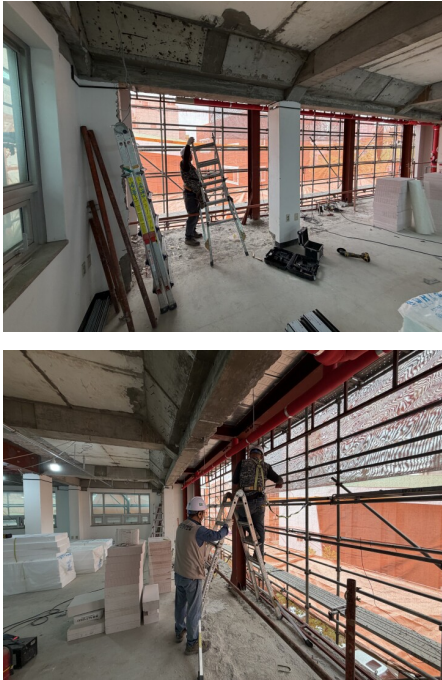
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-07 (2026-04-20)	현장 내	외부 비계 상부에서 작업 시 근로자 안전고리 미체결 상태에서 작업 중 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 2미터 이상 고소 작업 시 근로자 안전대 부착설비 설치 - 근로자 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 - 건물과 외부비계 사이 틈새망 설 치 실시 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44 조(추락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안 전대를 착용시킨 경우 안전대를 안 전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리 는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부속설비의 이 상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	해당 작업 종료
2026-04-07 (2026-04-20)	현장 내	용접 작업 시 불티비산방지조치 미흡 (용접우산 또는 버미글라스, 소화기) 으로 인한 화재 위험	[기술지도요원 강조사항] - 용접 작업 시 작업구간 내 소화 기 및 방화수 비치 - 불티 비산 방향으로 용접우산, 버미글라스 설치 - 화기취급 작업구간 화재감시자 지정 및 배치 * 불꽃에 의한 화재, 폭발 예방불티비 산방지커버 사용 [불꽃이 생기는 작업, 용접 등 작업 을 할 경우 불티에 의한 화재, 폭발을 방지해야 한다.] - 연마기, 연삭기를 사용하여 철골 등을 가공, 절단 할 경우 그에 의한 불꽃비산을 방지하기 위해 불티비 산방지커버를 설치 할 것. - 지면에서 떨어진 곳에서 용접작업 등 불꽃이 발생하는 작업을 할 경 우 불꽃반이(우산형 불티방지포)를 사용하여 화재, 폭발을 예방할 것. - 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우, 작업공간 내에 소화설비(소화기)를 설치할 것.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-07 (2026-04-20)	현장 내	원치를 사용하여 중량물 취급 및 양 중 작업 시 중량물 낙하, 상부 작업 자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 상부 작업자 추락방지조치 실시 (별도 안전대 부착설비를 설치하여 단부에 의한 추락재해 예방 조치 실시) - 근로자 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 - 중량물 운반, 양중 작업 시 하부 통제 및 작업지휘자 배치 후 작업 - 줄걸이, 달기기구, 원치 등 사용 하는 공구에 대한 안전점검 실시 ----- * 중량물 인양 작업시 작업공간 내부 에 근로자 출입으로 인해 협착, 맞음 위험 [중량물 인양 작업 시 작업공간 내부 에 출입하지 않고 외부에서 작업을 지휘할 것.] - 작업지휘자를 배치하여 전체 작업 을 지휘하고 통제할 것. - 인양물(중량물)이 흔들림을 방지하 기 위해 줄걸이상태 및 2줄걸이로 인양 할 것. - 중량물작업계획서를 작성하고 계획 서를 이행 할 것. - 중량물과 근로자가 근접하게 있지 않도록 할 것. - 중량물 인양작업에 투입되는 근로 자에게 중량물인양에 관한 교육을 실시 할 것.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	단부 근처에서 사다리 작업 중 추락 위험(즉시 이행) 	[기술지도요원 강조사항] - 작업발판으로 사용을 지양하고 이동 용으로만 사용 - 말비계, 이동식비계 등 작업발판 사용이 곤란한 경우 협소한 공간에서만 사다리 사용 - 협소한 공간 내에서 2인1조 이상 작업 준수 - 최상단 발판은 사용을 금지하며, 흔들림 없이 고정 조치 할 것 - 단부 근처에서 사다리 작업 시 근로자 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 - 건물과 외부 비계 사이 틈새망 설치 철저 ----- [사다리 안전사항] - 견고하고 심한 손상 · 부식이 없는 재료 사용할 것 - 발판의 간격은 일정하고, 폭 30cm 이상 일 것 - 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록 할 것 - 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 - 작업발판으로 사용을 지양하고 수직 이동통로 시설로 사용을 한정할 것 - 손, 발, 무릎 등 사용하여 3점 접촉 상태를 유지할 것 - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업 실시 할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	용접기 사용 시 작업구간 소화기 미비치로 인한 화재 발생 위험(즉시 이행) 	[기술지도요원 강조사항] - 불티 비산 방지 덮개 및 용접우산 등 설치 - 작업구간 소화설비(소화기) 비치 - 작업자 보안면 등 착용으로 안구손상 예방 ----- [불꽃이 생기는 작업, 용접 등 작업을 할 경우 불티에 의한 화재, 폭발을 방지해야 한다.] - 연마기, 연삭기를 사용하여 철골 등을 가공, 절단 할 경우 그에 의한 불꽃비산을 방지하기 위해 불티비산방지커버를 설치 할 것. - 지면에서 떨어진 곳에서 용접작업 등 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우 불꽃받이(우산형 불티방지포)를 사용하여 화재, 폭발을 예방할 것. - 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우, 작업 공간 내에 소화설비(소화기)를 설치할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능
현장 내	휴대용 연삭기 사용 중 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험 	[기술지도요원 강조사항] * 휴대용 연삭기 안전수칙 - 날접촉 방호덮개 설치 - 불티비산 방향으로 불티비산방지포 설치 - 근로자 보안경 등 적정 보호구 착용 - 불안정한 상태 및 행동에서의 작업 금지 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전 대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 설비작업	4.	7.
	2. 금속 및 하지 작업	5.	8.
	3. 승강기 작업	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
설비 작업	말비계, 이동식비계 등 작업발판 사용으로 인한 전도 및 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식비계, 말비계 등 작업발판 사용 시 안전난간, 아우트리거 등 안전시설 선 설치 후 작업 바랍니다. ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)] - 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것. - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것. - 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것. - 말비계의 높이가 2m를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것. - 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·쇄기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 아우트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것. - 승강용사다리는 견고하게 설치할 것. - 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것. - 작업발판은 항상 수평을 유지할 것. - 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대, 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것. - 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
설비 작업	휴대용 연삭기 사용 중 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] 휴대용 연삭기 사용 시 날접촉 방호덮개 설치 후 작업 바랍니다. ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
금속 및 하지 작업	금속 및 하지 용접 시 불티 비산에 의한 화재 위험	[기술지도요원 강조사항] - 용접 시 불티 비산방향으로 불티비산방지포 및 용접우산 설치 - 작업구간 내 소화기 및 방화수 비치 - 화기감시자를 지정하여 화기취급 작업구간 상주 관리 실시 - 작업공간 내 폐기물 등 인화성, 가연성 자재 정리 및 제거 실시 - 근로자 용접 보안면 등 적정 보호구 지급으로 착용 관리 실시로 안구손상 예방 철저 - 작업 전 화기 취급 작업에 대한 특별안전보건교육 실시 등 근로자 위험성 주지 * 불꽃에 의한 화재, 폭발 예방불티비산방지커버 사용 [불꽃이 생기는 작업, 용접 등 작업을 할 경우 불티에 의한 화재, 폭발을 방지해야 한다.] - 연마기, 연삭기를 사용하여 철골 등을 가공, 절단 할 경우 그에 의한 불꽃비산을 방지하기 위해 불티비산방지커버를 설치 할 것. - 지면에서 떨어진 곳에서 용접작업 등 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우 불꽃받이(우산형 불티방지포)를 사용하여 화재, 폭발을 예방할 것. - 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우, 작업공간 내에 소화설비(소화기)를 설치할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
금속 및 하지 작업	고속절단기 사용 시 불티방지덮개 및 소화기 미배치로 인한 화재 위험, 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] - 날접촉 방호덮개 설치 후 작업 - 불티비산방향으로 불티비산방지 덮개 설치 및 소화기 비치 후 작업 - 고정바이스 설치 및 사용, 자재 흔들림 발생하지 않도록 안정된 자세에서 작업 실시 * 위험기계·기구 방호조치 기준 제5장 금속절단기 [고속절단기 사용 안전대책] - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 크랭크핸들 부착 사용 - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 소화기 비치	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
승강기 설치 작업	E/V실 단부노출로 인한 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 안전대 부착설비 설치 및 근로자 안전대 착용, 안전고리 체결 후 작업 - 하부 낙하물 재해 예방 근로자 통제 및 출입 금지조치 실시 - E/V 설치 작업 전 작업계획 수립 및 위험성평가 실시 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
 	자료명칭	사다리 사용 시 안전 수칙		
	제공수(종류)	1	교육인원	1
	교육내용	- 작업발판으로 사용을 지양하고 이동용으로만 사용 - 말비계, 이동식비계 등 작업발판 사용이 곤란한 경우 협소한 공간에서만 사다리 사용 - 협소한 공간 내에서 2인1조 이상 작업 준수 - 최상단 발판은 사용을 금지하며, 흔들림 없이 고정 조치 할 것		

장비

사진	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	현장 내
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	321Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-08~2026-04-20	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
