

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서


담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	압구정나들목 리모델링 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	14281119506 (92507663657)
	공사기간	2025-07-08 ~ 2026-07-07	공사금액	565,887,982 원
	책임자	나정택	연락처 (이메일)	010-4487-5905 (rk2003413@naver.com)
	주소	서울 강남구 압구정로 403 압구정 나들목		

본사	회사명	주식회사명진건설이앤지	법인등록번호 (사업자등록번호)	1345110122785 (142-81-11950)
	면허번호	01-4608	연락처	02-438-7715
	주소	서울 성북구 오패산로3길 17		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-09
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	78%
횟수	(14) 회차 / 총 (24) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 나정택 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 도장, 천정 설치 작업 / 작업인원 : 12명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 그라인더, 핸드 드릴 등 유해위험물질 : 페인트, 신나 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 사다리 작업 시 불안정한 자세로 인한 근로자 추락 위험 2) 도장작업 시 유해위험물질로 인한 근로자 건강상해 위험 3) 이동식 틀비계 사용 시 상부 난간대 미 설치로 인한 추락 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

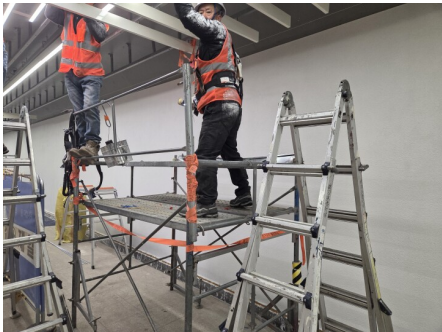
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-20 (2026-04-10)	야외 작업 구 간	경사면 사다리 작업 시 전도 및 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] -사다리 작업 시 아웃 트리거 설치 및 확장 하여 전도 위험 예방 -단독 작업 금지 및 관리자 상주 -상부 작업시 안전대 착용 및 안전 고리 체결 -위험성 평가 해당 내용 기입 및 근로자 교육 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌 어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추 락, 전도 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2 4조(사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조 (사다리 작업)] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작 업실시할 것 - 임의제작 목재사다리 사용금지 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	해당 작업 종료
2026-03-20 (2026-04-10)	야외 작업 구 간	근로자 작업 구간 합판, 발판 등 미 고정으로 인한 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 해당 발판, 합판 등 고정 조치 할 것 - 낙하 위험 예방 조치 할 것 - 하부 인원 통제 및 위험성 교육 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제7 장 제56조(작업발판의 구조) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제7 장 제55조(작업발판의 최대적재하중) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제9 조(작업발판 등) [작업발판 안전사항] [작업발판 적재하중 안전사항] [작업발판 구조 안전사항] - 발판재료는 작업할 때의 하중을 견 딜 수 있도록 견고한 것으로 할 것 - 작업발판의 지지물은 하중에 의하 여 파괴될 우려가 없는 것을 사용 할 것 - 작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지 지 않도록 둘 이상의 지지물에 연 결하거나 고정시킬 것 - 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 경우에는 위험 방지에 필요한 조치 를 할 것 - 틈 사이로 물체 등이 떨어질 우려 가 있는 곳에는 출입금지 등의 조 치를 할 것	이행

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-20 (2026-04-10)	터널 내 작업 구간	이동식 틀비계 사용 시 전도 및 근로 자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 상부 난간대 설치 및 점검 할 것 - 아웃트리거 등 전도 위험 예방 조치 할 것 - 해당 작업의 위험성 교육 및 관 리자 상주 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계) [이동식비계 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)] - 갑작스로 이동 또는 전도 방지를 위해 브레이크·썰기등으로 바퀴 고정할 것 - 비계 일부를 시설물에 고정 또는 아웃트리거 설치할 것 - 비계 최상부 작업 시 안전난간 설 치할 것 - 승강용사다리 견고하게 설치할 것 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
터널 내 작업 구간	사다리 작업 시 근로자 추락, 전도 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 사다리 작업 시 안전대 지급 및 고리 체결 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 ! 현장 내 사다리, 말비계 등 고소작업 시 안전고리 체결 미 이행 반복 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조(이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사다리 작업)] - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업 실시 할 것 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 ----- 즉시 이행가능
터널 내 작업 구간	이동식 틀비계 사용 시 전도 및 근로자 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 상부 난간대 설치 및 점검 할 것 - 아웃트리거 등 전도 위험 예방 조치 할 것 - 해당 작업의 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조 (이동식비계) [이동식비계 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조 (이동식비계)] - 갑작스로 이동 또는 전도 방지를 위해 브레이크 · 췌기등으로 바퀴 고정할 것 - 비계 일부를 시설물에 고정 또는 아웃트리거 설치할 것 - 비계 최상부 작업 시 안전난간 설치할 것 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 ----- 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
터널 내 작업 구간	유해위험 물질 사용 시 보호구 미 착용 으로 인한 근로자 건강장해 위험 	[기술지도요원 강조사항] - MSDS교육 진행 후 서면 보관 할 것 - 작업전 해당 위험 전파 할 것 - 해당 위험에 맞는 보호구 지급 할 것 ----- * 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건 자료에 관한 기준 [물질안전보건자료 안전사항] [산업안전보건법 제110조(물질안전보건자 료의 작성 및 제출)] [산업안전보건법 제114조(물질안전보건자 료의 게시 및 교육)] - 물리, 화학적 특성, 독성에 관한 정보가 작성되어 있을 것 - 폭발·화재 시의 대처방법, 응급조치 요령이 작성되어 있을 것 - 대상화학물질 취급근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 물질안전보건자 료 항상 게시할 것 - 물질안전보건자료 용기 및 포장에 경고 표지 부착 또는 인쇄 등 유해·위험 경 보가 나타나도록 할 것 - 경고표지를 부착하거나 경고표지 내용 인쇄 방법 표시가 곤란한 경우 경고표지 를 인쇄한 꼬리표를 달아 둘 것 - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하 여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치 를 하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통 (4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 지식산업센터 기계.소방 공사 현장에서 소화배관 설치 실측을 위해 배관공이 이동식 사다리를 올라가다 1.7m 높이에서 떨어져 치료 중 사망 예방대책 : 평탄, 견고하고 미끄럼이 없는 바닥에서 2인1조로 작업하고 안전모를 반드시 착용합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 케노피 설치 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
케노피 설치 작업	고소, 상부 작업 시 안전고리 미 체결로 인한 근로자 추락 위 험	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 안전고리 체결 후 작업 시작 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락 의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추 락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제23조(지 지로프-설치)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등 에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방 법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란 한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하 기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이 상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착 용할 것 - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상 의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있 는 설비 등을 설치하여야 한다. - 지지로우프 설치 시 지지로우프지주는 강관 틀비계의 기동재에 설치.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
케노피 설치 작업	고소, 상부 작업 시 자재, 공구 등 낙하로 인한 근로자 상해 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업구역 설정하여 근로자,보행자 통제할 것 -상부,고소작업시 자재,공구 등 낙하 위험성 교육진행할 것 -관리자 상주 및 전담 유도원 등 배치하여 위험 상황 대비할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근로자 맞음 위험 * 철거 작업 중 낙하물방지망 미설치로 인한 근로자 비래 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(작업장-낙하물에 의한 위험의 방지)] [낙하물방지망을 설치하여 낙하물에 대한 보호 조치를 할 것.] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설치] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 떨어질 위험이 있는 낙하물은 즉시 제거 할 것. - 낙하물 방지망을 설치할 것. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작업장 출입을 금지시킬 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인,타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
---	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	건설현장 12대 사망사고 기인물		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	사다리, 추락 관련 교육 진행		

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-25~2026-04-09	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
