

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서


담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	목동센트럴푸르지오 1~10년차합의공사중외벽재도장및지하5층라이	사업장관리번호 (사업개시번호)	38187010116 (92601255697)
	공사기간	2026-02-09 ~ 2026-06-30	공사금액	245,337,400 원
	책임자	방영호	연락처 (이메일)	010-3359-2743 (kjiw8533@naver.com)
	주소	서울 양천구 오목로 354		

본사	회사명	주식회사지우산업개발	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101116732576 (381-87-01011)
	면허번호	01-5704	연락처	02-892-7090
	주소	서울 금천구 시흥대로 97		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-15
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	50%
횟수	(2) 회차 / 총 (4) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 방영호 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 외벽 프라이머 작업 / 작업인원 : 5명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 전동 드릴, 그라인더 유해위험물질 : 프라이머,페인트 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 외벽 달비계 작업 시 근로자 추락 위험 2) 외벽 작업 시 공구, 자재 등 낙하 위험 3) 안전대, 생명로프 등 안전 장구류 미 점검으로 인한 추락 위험		



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치						
구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☒	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-25 (2026-04-16)	야외 외벽 작업 구간	달비계 작업 시 근로자 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 로프, 안전대 등 점검 양호 - 옥상 로프 훼손 등 감시자 배치 양호 - 작업 전 위험성 교육 및 서면 보관상태 양호 ----- * 달비계 작업 시 옥상 등에 감시자를 배치하여 로프의 훼손 등을 방지할 것 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조(달비계의 구조)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제64조(달비계의 점검 및 보수)] [달비계 작업 시 로프 훼손 방지 등을 위한 감시자 배치] - 달기 강선 및 달기 강대는 심하게 손상·변형, 부식된 것을 사용하지 않도록 할 것. - 달기 와이어로프, 달기 체인, 달기 강선, 달기 강대는 한쪽 끝을 비계의 보 등에, 다른 쪽 끝을 내민 보, 앵커볼트, 건축물의 보 등에 각각 풀리지 않도록 설치할 것. - 근로자의 추락 위험을 방지하기 위하여 다음의 조치를 할 것. - 달비계에 구명줄을 설치할 것. - 근로자에게 안전대를 착용하도록 하고 근로자가 착용한 안전줄을 달비계의 구명줄에 체결하도록 할 것. - 달비계에 안전난간을 설치할 수 있는 구조인 경우에는 달비계에 안전난간을 설치할 것. - 사업주는 작업의자형 달비계를 설치하는 경우에는 다음 각 사항을 준수해야 한다. - 옥상에 감시자를 배치하여 로프의 훼손등을 예방 할 것. - 작업 전 TBM, 교육을 통해 달비계 사용 안전작업 수칙 전파 할 것. - 로프의 점검을 통해 이상 시 교체하고 수시로 점검 할 것.	이행

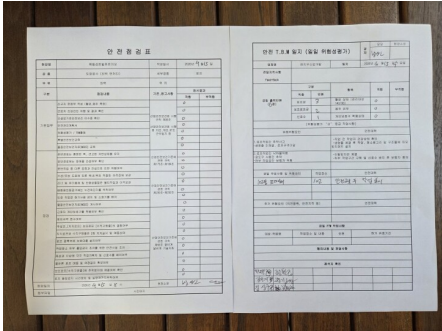
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-25 (2026-04-16)	외벽 작업 구 간	상부 작업 시 자재, 공구 등 낙하로 인한 근로자 상해 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 하부 작업 구획설정 양호 - 작업 전 tbm 시 해당 위험성 교 육 양호 - 이탈방지끈 등 안전도치 양호 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자 재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근로자 맞음 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14 조(작업장-낙하물에 의한 위험의 방 지)] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설 치] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보 호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경 우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방 호선반의 설치, 출입금지구역의 설 정, 보호구의 착용 등 위험을 방지 하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작 업장 출입을 금지시킬 것. - 떨어질 위험이 있는 낙하물은 즉시 제거 할 것. - 낙하물 방지망을 설치할 것. - 로프 등을 이용하여 고정 할 것.	이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
건물 외벽 작업 구간	근로자 달비계, 외벽 작업 시 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 해당 위험성 교육 진행 양호 - 관리자 상주하여 로프훼손 예방 조치 양호 - 위험성평가 작성 시 근로자 교육 진행 양호 ----- * 달비계 작업 시 옥상 등에 감시자를 배치하여 로프의 훼손 등을 방지할 것 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조 (달비계의 구조)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제64조 (달비계의 점검 및 보수)] [달비계 작업 시 로프 훼손 방지 등을 위한 감시자 배치] - 사업주는 곤돌라형 달비계를 설치하는 경우에는 다음 각 사항을 준수해야 한다. - 다음 어느 하나에 해당하는 와이어로프를 달비계에 사용해서는 아니 된다. - 이음매가 있는 것. - 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10% 이상인 것. - 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것. - 꼬인 것. - 작업하는 근로자의 하중을 견딜 수 있을 정도의 강도를 가진 작업용 섬유로프, 구명줄 및 고정점을 사용할 것. - 옥상에 감시자를 배치하여 로프의 훼손 등을 예방 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
옥상 작업 구간	사다리 작업 시 근로자 추락, 전도 위험 	[기술지도요원 강조사항] -사다리 작업 시 아웃 트리거 설치 및 확장 하여 전도 위험 예방 -단독 작업 금지 및 관리자 상주 -상부 작업시 안전대 착용 및 안전고리 체결 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조(이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사다리 작업)] - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업실시할 것 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능
야외 작업 구간	위험성 평가 작성 시 근로자 참여 할 것 	[기술지도요원 강조사항] - 위험성평가 내 해당 작업의 유해요소 포함은 양호하나, 근로자 참여하여 작성 할 것 - 위험성평가 작성 시 전화차 피드백 등 갱신 권장 [산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)] - 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아낸다. - 찾아낸 유해·위험요인 - 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가. - 찾아낸 유해·위험요인 - 평가결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치하기. - 찾아낸 유해·위험요인 - 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치하기. - 사업주는 찾아낸 유해·위험요인 평가 시 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 작업장의 근로자를 참여시켜야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 도시형생활주택 공사현장에서 건물 외벽 유리 청소작업 중 달비계 작업용 로프가 파단되며 10m 아래 바닥으로 떨어져 사망 예방대책 : 달비계 작업 시 구명줄을 설치하고 근로자가 착용한 안전줄을 달비계의 구명줄에 체결하도록 관리감독 합니다. 안전대 등 보호구를 지급하고 작업용 로프 등의 상태를 점검합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 옥외 도장 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
옥외 도장 작업	고소, 단부구간 작업 시 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 안전대, 추락방지 도구, 기구 점검 할 것 - 위험성 평가 작성 및 근로자 교육 할 것 - 관리자 상주 및 근로자 단독작업 금지 시킬 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락 의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추 락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조(안전 대의 사용)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등 에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방 법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란 한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하 기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이 상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착 용할 것 - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상 의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있 는 설비 등을 설치하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
옥외 도장 작업	고소, 상부 작업 시 자재, 공구 등 낙하로 인한 상해 위험	[기술지도요원 강조사항] - 공구 이탈방지조치 할 것 - 작업구역 설정 및 상부 자재등 즉시 제거 할 것 - 하부 전담 신호수 등 배치하여 근로자, 보행자 통제 할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근로자 맞음 위험 * 철거 작업 중 낙하물방지망 미설치로 인한 근로자 비래 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(작업장-낙하물에 의한 위험의 방지)] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물방지망을 설치하여 낙하물에 대한 보호 조치를 할 것.] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설치] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 낙하물 방지망을 설치할 것. - 로프 등을 이용하여 고정 할 것. - 떨어질 위험이 있는 낙하물은 즉시 제거 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	추락 위험 방지 교육		
	제공수(종류)	4	교육인원	6
	교육내용	-위험한장소에 작업발판, 안전난간 설치 -개구부 덮개 설치 -안전대 착용 및 부착설비 설치 관련 교육 실시		

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-26~2026-04-15	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성**, 최근 국내 영향 태풍은 증가세

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
