

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	신월1동 주민센터 건립공사(철거 및 지반조성)	사업장관리번호 (사업개시번호)	48881002666 (92601539377)
	공사기간	2026-02-27 ~ 2027-02-26	공사금액	1,280,864,000 원
	책임자	안태선	연락처 (이메일)	010-2369-7946 (casari0767@gmail.com)
	주소	서울 양천구 곰달래로3길 13(신월동)		

본사	회사명	가사리이앤씨주식회사	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-6016235 (488-81-00266)
	면허번호	01-5145	연락처	02-3463-2230
	주소	서울 송파구 새말로11길 5		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-21
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	1%
횟수	(1) 회차 / 총 (24) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 안태선 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 현재작업공정 : 책서포트 인력 설치 / 작업인원 : 4명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 전동 드릴 유해위험물질 : 해당 없음 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 책서포트 인력 설치 시 자재 전도로 인한 협착 위험 2) 사다리 작업 등 고소, 상부 작업 시 전도, 추락 위험 3) 이동식 비계 사용 시 난간대 미 설치로 인한 근로자 전도, 추락 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

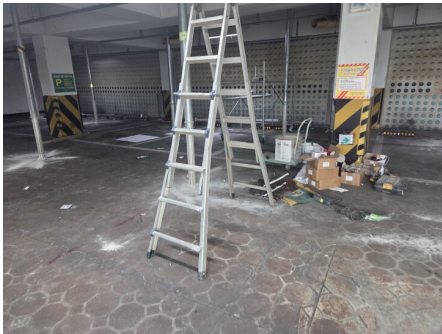
3. 이전 기술지도 사항 이행여부

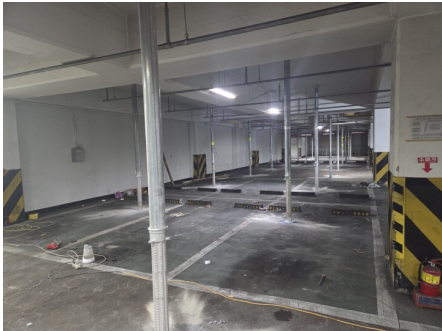
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법								
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
지하 작업 구간	이동식 틀비계 사용 시 전도 및 근로자 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 상부 난간대 설치 및 점검 할 것 - 아웃트리거 등 전도 위험 예방 조치 할 것 - 해당 작업의 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조 (이동식비계) [이동식비계 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조 (이동식비계)] - 갑작스로 이동 또는 전도 방지를 위해 브레이크 · 썰기등으로 바퀴 고정할 것 - 비계 일부를 시설물에 고정 또는 아웃트리거 설치할 것 - 비계 최상부 작업 시 안전난간 설치할 것 - 승강용사다리 견고하게 설치할 것 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능
지하 작업 구간	사다리 작업 시 근로자 추락, 전도 위험 	[기술지도요원 강조사항] -사다리 작업 시 아웃 트리거 설치 및 확장 하여 전도 위험 예방 -단독 작업 금지 및 관리자 상주 -상부 작업시 안전대 착용 및 안전고리 체결 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조(이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사다리 작업)] - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업실시 할 것 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
지하 작업 구간	잭서포트 설치, 운반, 작업 시 자재 전도로 인한 협착 위험 등 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 위험성 근로자 교육 할 것 - 고정조치 확인 후 근로자 이탈 시킬 것 - 관리자 상주 및 단독작업 금지 시킬 것 ----- * 불안정한 자재 적치상태로 인한 근로자 맞음 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(작업장-전도의 방지)] [물건을 적치 할 경우 평평한 곳에 두고 전도되거나 굴러떨어질 위험이 없게 고정 할 것.] - 사업주는 제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 해야 한다. - 평평한 곳에 두고 전도되지 않도록 할 것. - 작업장 주변에 통제하고 관계근로자 외 출입을 통제할 것.	가능성 (1)
			중대성 (3)
			 보통(3) 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 사옥 신축 공사현장 건물 6층 베란다에서 벽체 평탄화 작업을 위해 작업자가 이동식 비계에 올라가던 중 2층 바닥(15m)으로 떨어져 사망 예방대책 : 평탄, 견고하고 미끄럼이 없는 바닥에서 2인1조로 작업하고 안전모를 반드시 착용합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 토공작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
토공작업	굴착기 작업 시 신호수 미배치 로 인한 근로자, 보행자 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] 굴착기 사용 작업 중 근로자 및 타 장비와 의 충돌예방을 위해 신호수를 배치할 것 신호수 배치 및 관리자 상주하여 근로자, 보행자 통제 할 것 작업계획서 작성 및 관리감독자, 신호수 배치도 기입 할 것 작업 구역 설정 후 작업 시작 할 것 ----- * 굴착기 후방 접근금지 표시물 미부착등으로 인해 주변 근로자 접근시 협착, 충돌 위험 * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제2절 굴착 기 [굴착기 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의5 (굴착기-인양작업 시 조치)] [굴착기 후방 접근금지 표시물 부착 할 것.] - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것 - 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확 보할 것 - 경보기를 부착하여 굴착기 후진 시 경보음 을 통해 주변 근로자에게 주의 시킬 것. - 후방카메라를 설치하여 접근 근로자 등을 확인 할 것. - 굴착기 후방 접근금지 표시물 부착하여 주 변 근로자 접근 금지 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
토공작업	작업구간 개구부 등 근로자 전 도, 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 해당 위험성 교육 시킬 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 작업 구간 안전고리 체결 지지로프 등 선 설치 할 것 - 관리자 상주 하여 안전조치 이행 수시로 확인 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개 구부 등의 방호 조치) [개구부 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추 락-개구부 등의 방호 조치)] [개구부 안전사항, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] - 근로자가 추락 위험 장소에는 안전난간, 울 타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방 호 조치 등 설치할 것 - 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어 지지 않도록 설치할 것 - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구 부임을 표시할 것 - 난간등을 설치불가할 경우 추락방호망 설치 할 것 - 해체된 안전난간 원상복구조치할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등		** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막 이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레 인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	4대 금지 캠페인		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	4대 금지 캠페인 자료 배포, 안내, 설명 - 안전장치는 절대 해제하지 않는다 - 모르는 기계는 조작하지 않는다 - 지정된 보호구 없이는 작업하지 않는다 - 가동 중인 기계는 정비하지 않는다		

장비

사진	내용			
	장비명	절연저항측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	1.0MΩ 이상		
	측정값	1.0 MΩ	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	조도계	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	158 Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9 %	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-21~2026-04-21	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
